

№14  
31.08.23  
14:20

## ЗАЯВКА

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

Парк Победы,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории Устьянского муниципального округа.

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные)

Чупрова Галина Дмитриевна тел. 89210838951

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: Устьянский муниципальный округ п. Кизема

3. Наименование (направление) инициативного проекта:

Ремонт мемориалов и мемориалов, иных объектов, не являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

Отсутствие места поклонения героям, павшим в Великой Отечественной войне и труженикам тыла. Памятные плиты с именами солдат и тружеников тыла – немые свидетели тех военных событий. Они молчат, но это молчание может многое сказать. Нужно только научиться их слышать. Нужно, проходя мимо, остановиться и задуматься: «А почему они здесь написаны?». При посещении Парка Победы жители и гости найдут инициалы своих близких, участвовавших в судьбоносных для страны событиях, которые всколыхнут сердца, заставят биться их сильнее, и они поняли, что не только наше поколение нуждается в памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, но и весь народ.

Пока мы будем помнить, Россия будет оставаться Великой державой. Мы должны знать историю своей страны и наш долг – передать эти знания нашим будущим поколениям. К сожалению, несмотря на множество книг, и фильмов о войне, с каждым годом становится все меньше и меньше людей, которые по-настоящему чтят память о Великой Победе. Нам нельзя забывать события тех времен и людей, что отдали за нас свои жизни. Наши бабушки и дедушки смогли передать нам память о Великой Отечественной войне, а мы должны сохранить и передать ее следующим поколениям. Это наша история, наше прошлое. А без прошлого, как известно, не бывает настоящего, а без настоящего — будущего. Пусть человеческая память и опыт учат нас добру, миролюбию и человечности. И пусть никто из нас не забудет героев, отдавших

свою жизнь за нашу свободу и счастье.

На наш взгляд, проект имеет приоритетное значение

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта

Для решения данной проблемы приняли решение обустроить «Парк Победы», установить памятные плиты с именами героев войны и труда.

Реализовав данный проект, мы решим первостепенную проблему патриотического воспитания и ряд второстепенных не менее важных, благоустройство территории и отдыха жителей и гостей. Решение о благоустройстве Парка Победы сможет объединить различные социальные и возрастные группы людей для совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

Данный объект востребован и будет использоваться долгие годы, для проведения мероприятий патриотической направленности.

В настоящее время на территории Парка Победы выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, постаменты для установке памятных плит, установлены чугунные скамьи, проведены работы по проведению электрических сетей)

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: На территории поселения появится современная благоустроенная территория патриотической направленности с возможностью проведения мероприятий, ознакомиться на памятных плитах с именами героев прошедших войну и тружеников тыла. Создаст условия для привлечения туристов на территорию. Срок эксплуатации объекта составит 30 лет.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта, социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: Локальный сметный расчет.

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 10 (десять) человек.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме проекта (процентов)
1	2	3	4
1	Средства областного бюджета	2839,25656	90
2	Средства местного бюджета	157,73648	5
3	Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет		
4	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет	157,73648	5
5	Сведения о планируемом (возможном)		

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта		
Всего	3154,72951	100

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:  
01.10.2024г.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: в Устьянском муниципальном округе проживают 23 600 человек

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).  
ТОС «Железнодорожный» на территории пос. Кизема успешно реализовал более 5 разноплановых проекта.

ТОС «Железнодорожный» основан в 2016 года

Реализованные проекты

«Взгляд по новому» 2017г. приобретение конструкторов «Лего»

«Наследие» 2018г. приобретение оборудование для проведения уличных мероприятий.

«КизПарк» 2019г. изготовление и приобретение МАФов.

«Территория здоровья» 2020г. ограждение спортивной площадки.

«Живи спортом» 2021г. приобретение и установка тренажеров.

«Озеро Возрождения» 2023г. Благоустройство набережной.


В Киземской сельской территории фактически проживают 2358 человек.

«25» августа 2023 г.

Чупрова Чупрова Галина Дмитриевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)





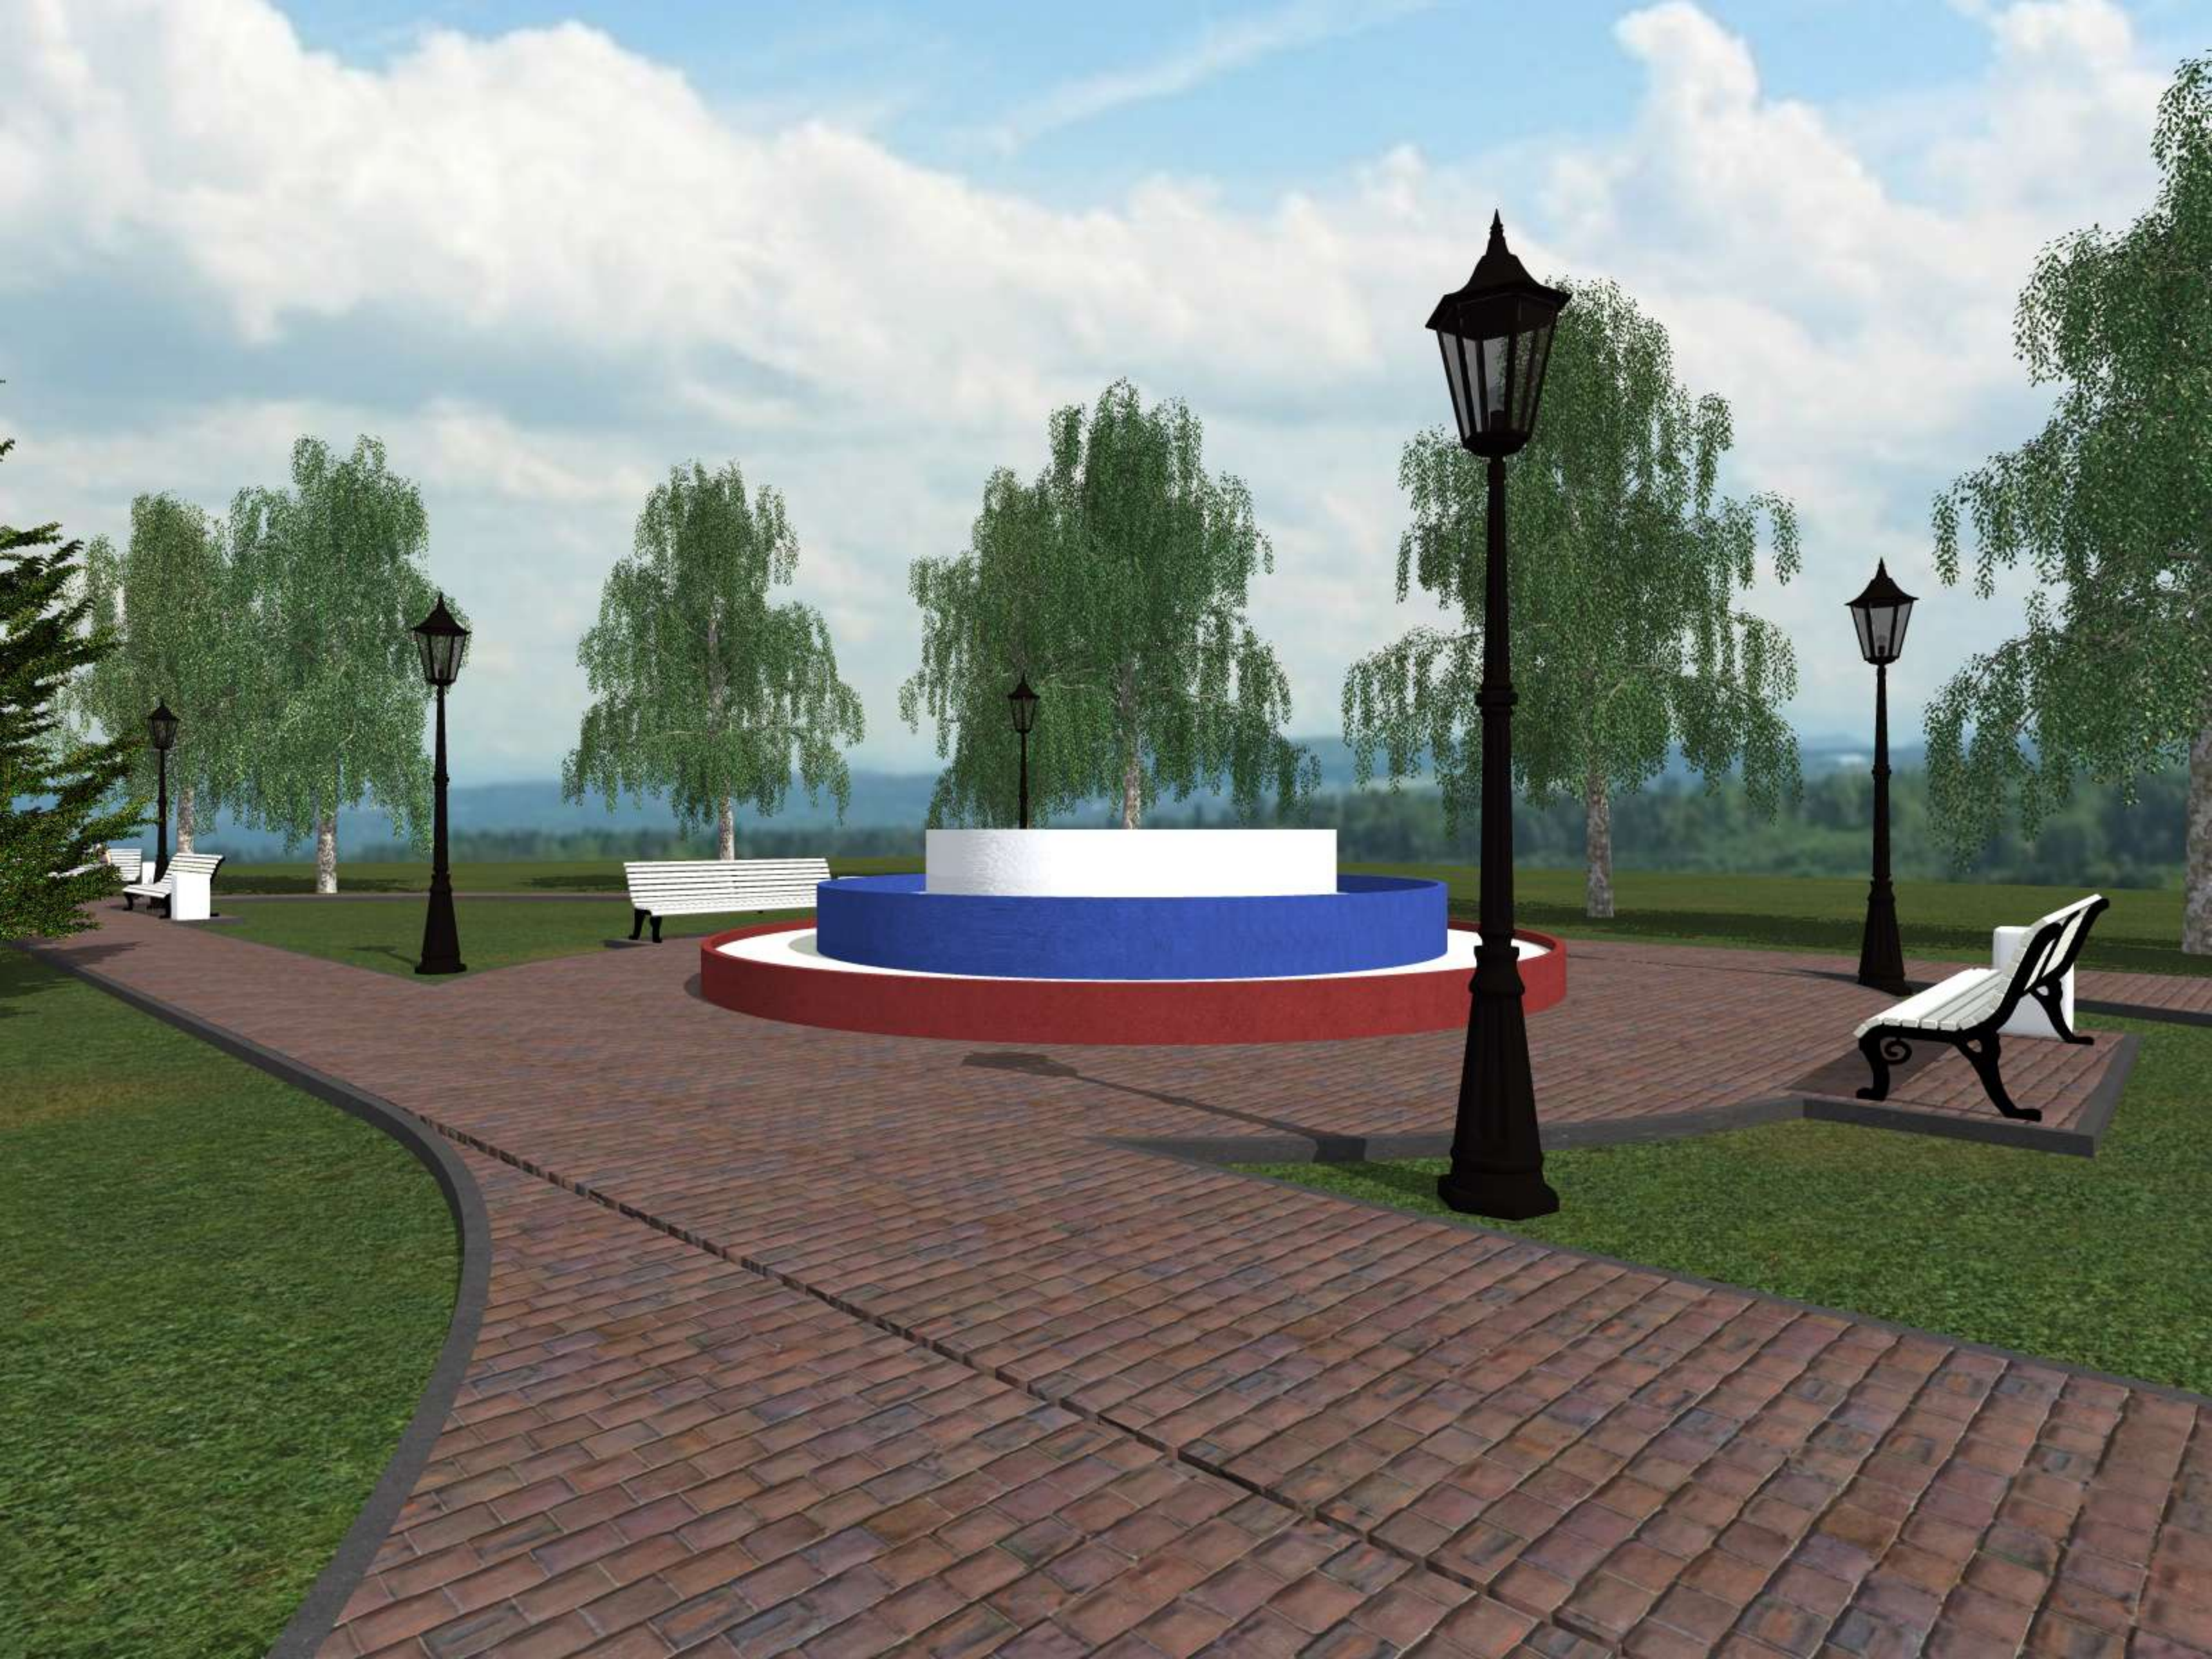






























Условные обозначения:

-  - граница земельного участка с кадастровым номером 29:18:150107:625
-  - проектируемое покрытие брусчаткой
-  - проектируемый бетонный тротуар
-  - проектируемые дорожные плиты
-  - проектируемое бетонное основание
-  - проектируемые клумбы
-  - проектируемые малые архитектурные формы
-  - существующий обелиск
-  - существующие деревья
-  - демонтируемые деревья
-  - проектируемые фонари
-  - проектируемые точечные светильники

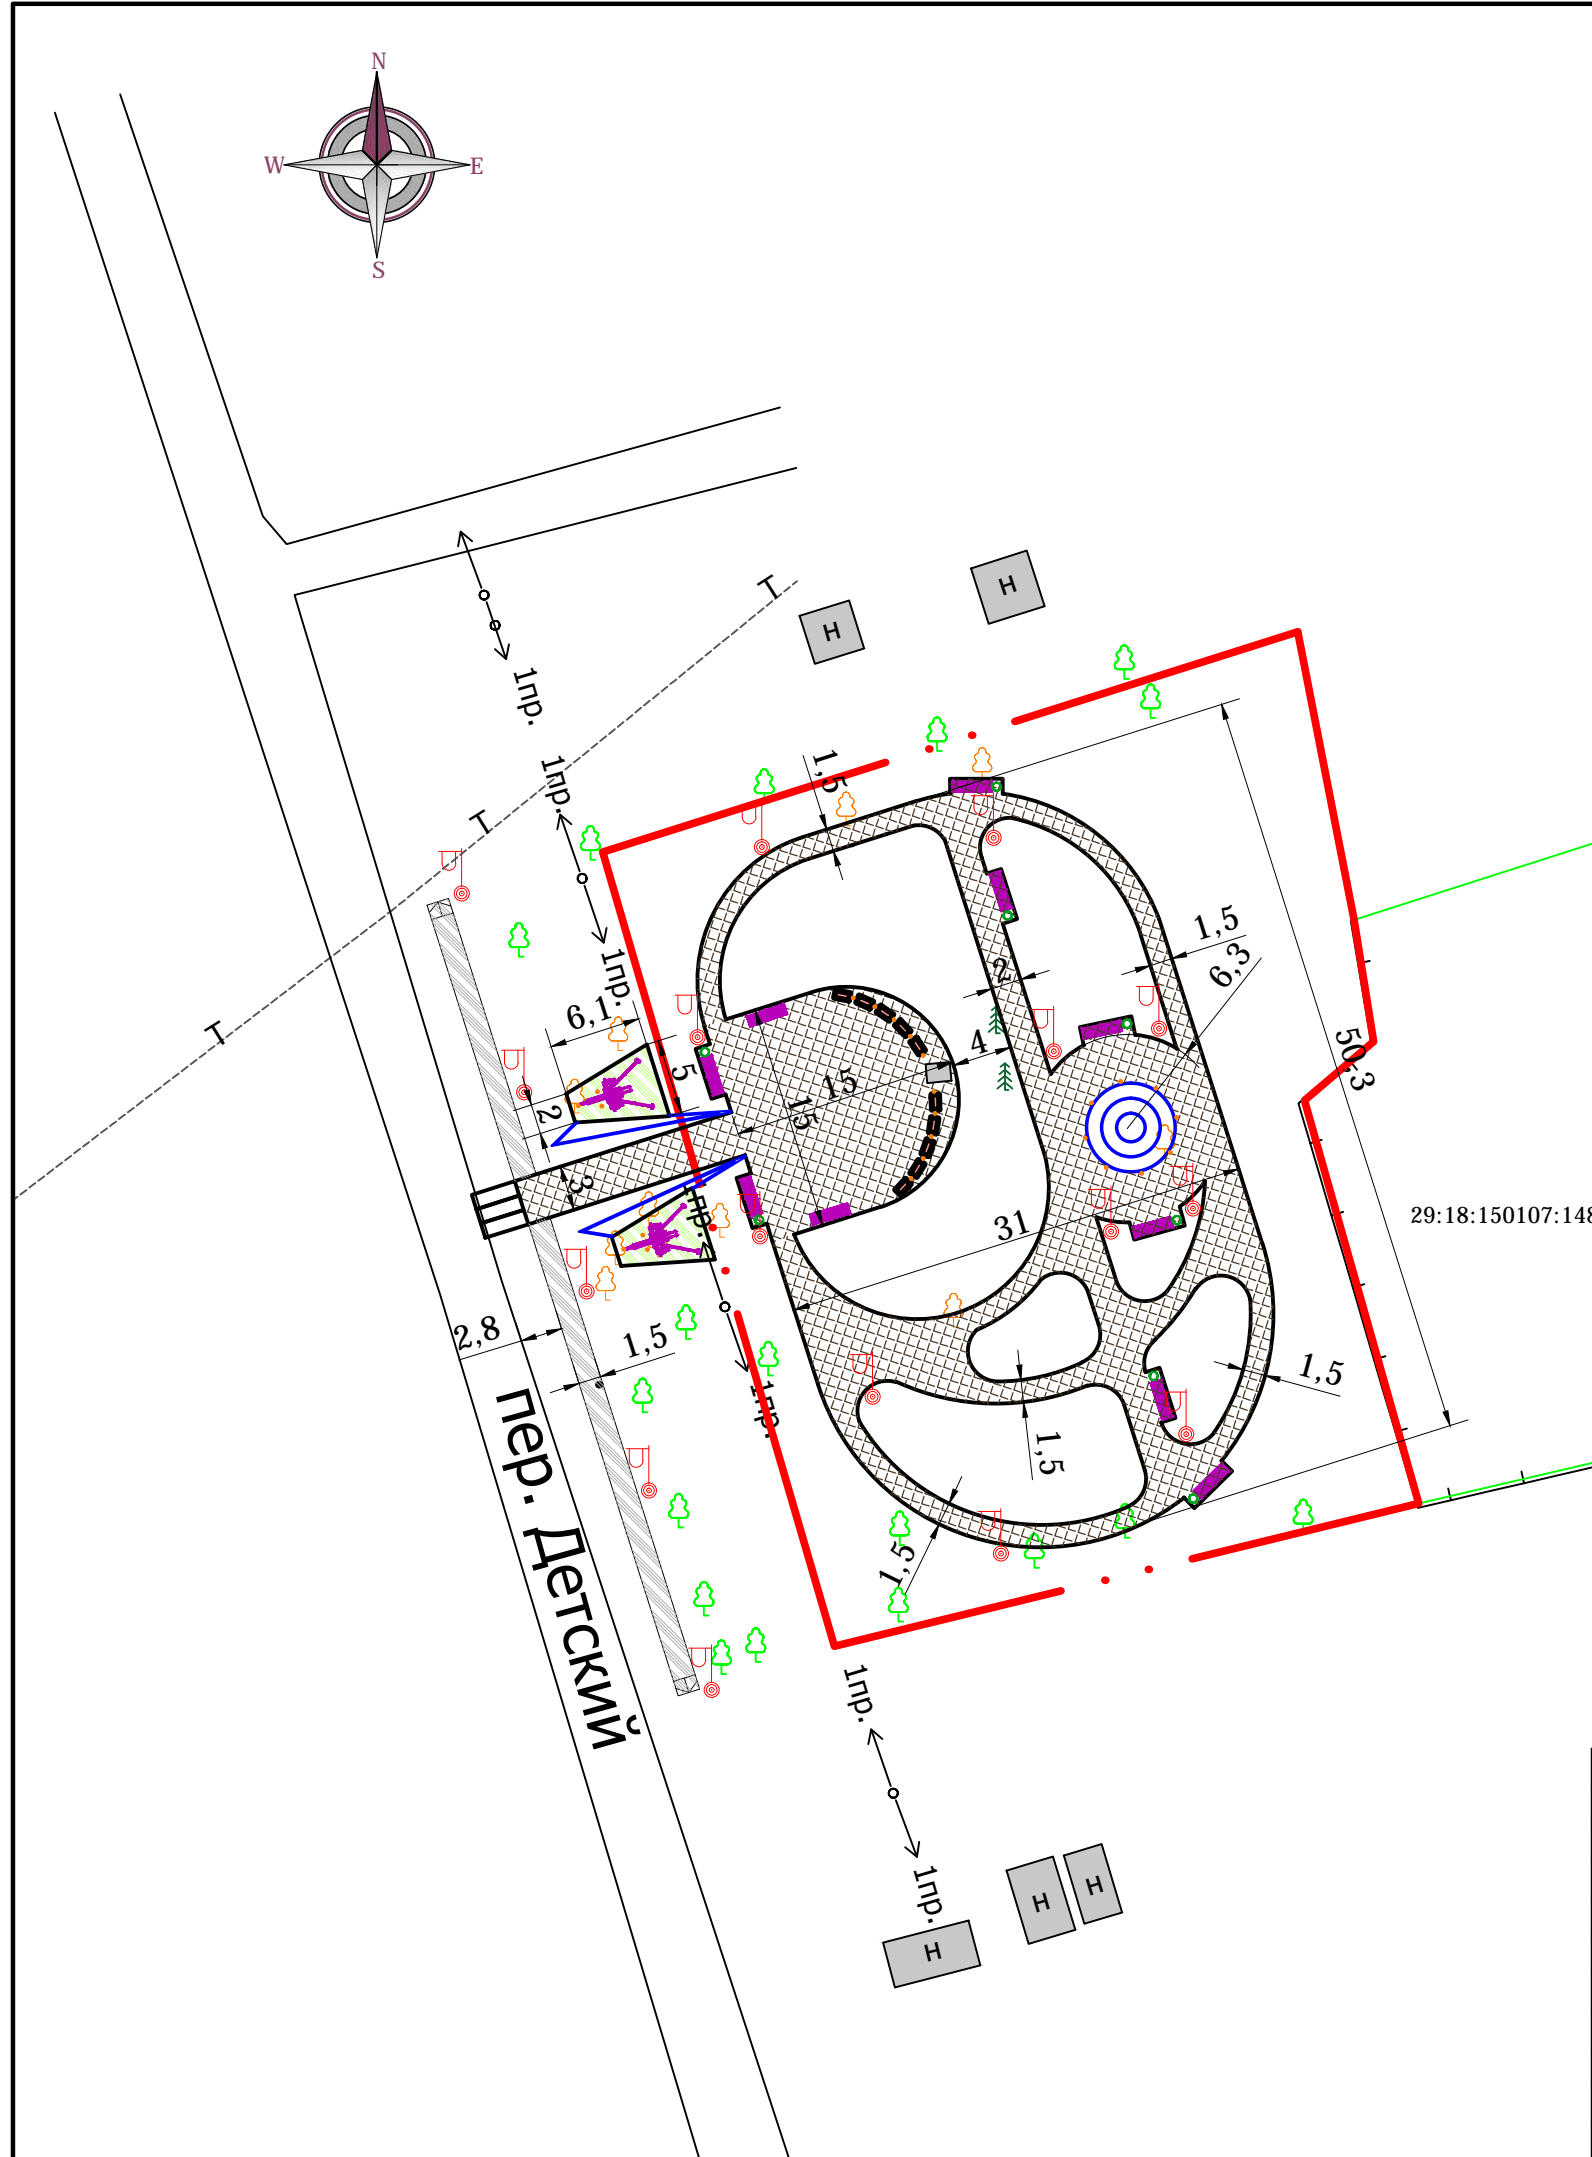

29:18:150107:148

Площадь покрытия брусчаткой - 773м<sup>2</sup>  
 Площадь покрытия бетоном - 78м<sup>2</sup>

						<b>013-17-ПЗУ</b>			
						Проект планировочной организации земельного участка			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Планировочная организация земельного участка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коробицына						П		
Проверил						План благоустройства территории	<b>"ООО ГорПроект"</b>		
Н.контр.									
ГИП	Мартюшов								

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_ 2023 года

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

29. Архангельская область

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_ (наименование стройки)

\_\_\_\_\_ (наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Кизема\_Парк Победы

\_\_\_\_\_ (наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ II квартал 2023 г.

<b>Сметная стоимость</b>	3154,73	(299,25) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
<b>строительных работ</b>	2518,00	(241,37) тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	59,39	(3,12) тыс.руб.
<b>оборудования</b>	0,00	(0) тыс.руб.
<b>прочих затрат</b>	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	153,83	(3,49) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		366,94 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		18,65 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР07-01-044-04</b>	<b>Установка монтажных изделий массой: более 20 кг</b>	<b>т</b>	<b>0,35</b>							
	<b>Демонтаж</b>										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1	ОТ					320,59	0,8	89,77	44,12	3 960,65
	2	ЭМ					203,76	0,8	57,05	14,35	818,67
	3	в т.ч. ОТм					10,90	0,8	3,05	44,12	134,57
	4	М					10 327,72	0	0,00	8,98	
		ЗТ	чел.-ч	31,4	0,8	8,792					
		ЗТм	чел.-ч	0,94	0,8	0,2632					
		Итого по расценке					10 852,07		146,82		
		ФОТ							92,82		4 095,22
	Пр/812-007.0-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			103,03		4 545,69
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			67,76		2 989,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>317,61</b>		<b>12 314,52</b>
<b>2</b>	<b>ФЕР46-04-001-05</b>	<b>Разборка: мелкоблочных стен</b>	<b>м3</b>	<b>4,845</b>							
		Объем=1,7*1,9*1,5									
	1	ОТ					47,53		230,28	44,12	10 159,95
	2	ЭМ					39,94		193,51	14,35	2 776,87
		ЗТ	чел.-ч	5,72		27,7134					
		Итого по расценке					87,47		423,79		
		ФОТ							230,28		10 159,95
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			211,86		9 347,15
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			119,75		5 283,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>755,40</b>		<b>27 567,14</b>
<b>3</b>	<b>ФЕР46-02-009-04</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных</b>	<b>100 м2</b>	<b>1,129</b>							
		Объем=112,9 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					262,39		296,24	44,12	13 070,11
		ЗТ	чел.-ч	33,64		37,97956					
		Итого по расценке					262,39		296,24		
		ФОТ							296,24		13 070,11
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			272,54		12 024,50
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			154,04		6 796,46
		<b>Всего по позиции</b>							<b>722,82</b>		<b>31 891,07</b>
<b>4</b>	<b>ФЕРр68-3-2</b>	<b>Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм</b>	<b>м3</b>			<b>2,5</b>					
		1 ОТ					37,63		94,08	44,12	4 150,81
		ЗТ	чел.-ч	4,49		11,225					
		Итого по расценке					37,63		94,08		
		ФОТ							94,08		4 150,81
	Пр/812-102.0-3	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			96,90		4 275,33
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			50,80		2 241,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>241,78</b>		<b>10 667,58</b>
<b>5</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-008</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=2,5*0,76</b>	<b>1 т груза</b>			<b>1,9</b>	<b>10,88</b>		<b>20,67</b>	<b>8,98</b>	<b>185,62</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,67</b>		<b>185,62</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,35+2,4*4,845+5,1934</b>	<b>1 т груза</b>			<b>17,1714</b>	<b>3,28</b>		<b>56,32</b>	<b>14,35</b>	<b>808,19</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56,32</b>		<b>808,19</b>
<b>7</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-200</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км Объем=1,9+17,1714</b>	<b>1 т груза</b>			<b>19,0714</b>	<b>86,21</b>		<b>1 644,15</b>	<b>14,85</b>	<b>24 415,63</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 644,15</b>		<b>24 415,63</b>
<b>8</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-201</b>	<b>Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ПЗ=67 (ОЗП=67; ЭМ=67 к расх.; ЗПМ=67; МАТ=67 к расх.; ТЗ=67; ТЗМ=67)</b>	<b>1 т груза</b>			<b>19,0714</b>	<b>0,37</b>	<b>67</b>	<b>472,78</b>	<b>14,85</b>	<b>7 020,78</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>472,78</b>		<b>7 020,78</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого прямые затраты (справочно)							3 154,85		67 367,28	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							710,37		31 341,52	
		Эксплуатация машин							306,88		4 403,73	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,05		134,57	
		Материалы							20,67		185,62	
		Перевозка							2 116,93		31 436,41	
		Строительные работы							4 231,53		114 870,53	
		Строительные работы							2 114,60		83 434,12	
		в том числе:										
		оплата труда							710,37		31 341,52	
		эксплуатация машин и механизмов							306,88		4 403,73	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,05		134,57	
		материалы							20,67		185,62	
		накладные расходы							684,33		30 192,67	
		сметная прибыль							392,35		17 310,58	
		Перевозка							2 116,93		31 436,41	
		Итого ФОТ (справочно)							713,42		31 476,09	
		Итого накладные расходы (справочно)							684,33		30 192,67	
		Итого сметная прибыль (справочно)							392,35		17 310,58	
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>4 231,53</b>		<b>114 870,53</b>	
<b>Раздел 2. Монтаж памятника, плит</b>												
9	ФЕР06-02-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 Объем=(1,7*1,9*1,5) / 100	100 м3				0,04845					
		1 ОТ							2 564,28	124,24	44,12	5 481,47
		2 ЭМ							2 037,72	98,73	14,35	1 416,78
		3 в т.ч. ОТм							256,16	12,41	44,12	547,53
		4 М							2 932,28	142,07	8,98	1 275,79
		ЗТ	чел.-ч	306			14,8257					
		ЗТм	чел.-ч	19,19			0,9297555					
		Итого по расценке							7 534,28	365,04		
		ФОТ								136,65		6 029,00
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103			103			140,75		6 209,87
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58			58			79,26		3 496,82
		<b>Всего по позиции</b>								<b>585,05</b>		<b>17 880,73</b>
10	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3				4,917675		665,00	3 270,25	8,98	29 366,85



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 270,25</b>		<b>29 366,85</b>	
11	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т			0,072675	7 997,23		581,20	8,98	5 219,18	
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
<b>Всего по позиции</b>									<b>581,20</b>		<b>5 219,18</b>	
12	ФЕР15-01-001-06	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2 (прим.)	100 м2			0,099						
Объем=(1,5*0,6*11) / 100												
1 ОТ									6 717,15	665,00	44,12	29 339,80
2 ЭМ									705,68	69,86	14,35	1 002,49
3 в т.ч. ОТм									108,14	10,71	44,12	472,53
4 М									2 011,94	199,18	8,98	1 788,64
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке									9 434,77	934,04		
ФОТ										675,71		29 812,33
Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы										682,47		30 110,45
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы										331,10		14 608,04
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 947,61</b>			<b>76 849,42</b>
13	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.18.2023_01	Мемориальные плиты	шт.			11	89 469,69		109 595,39	8,98	984 166,59	
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
<b>Всего по позиции</b>									<b>109 595,39</b>		<b>984 166,59</b>	
14	ФССЦпг-03-21-02-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 200 км	1 т груза			4	101,43		405,72	14,85	6 024,94	
<b>Всего по позиции</b>									<b>405,72</b>		<b>6 024,94</b>	
15	ФССЦпг-03-21-02-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза расстояние 445 км (445-200=245) ПЗ=245 (ОЗП=245; ЭМ=245 к расх.; ЗПМ=245; МАТ=245 к расх.; ТЗ=245; ТЗМ=245)	1 т груза			4	0,44	245	431,20	14,85	6 403,32	
<b>Всего по позиции</b>									<b>431,20</b>		<b>6 403,32</b>	
<b>Итого по разделу 2 Монтаж памятника, плит :</b>												
Итого прямые затраты (справочно)									115 582,84		1 071 485,85	
в том числе:												
Оплата труда рабочих									789,24		34 821,27	
Эксплуатация машин									168,59		2 419,27	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									23,12		1 020,06	
Материалы									113 788,09		1 021 817,05	
Перевозка									836,92		12 428,26	
Строительные работы									116 816,42		1 125 911,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							115 979,50		1 113 482,77
		в том числе:									
		оплата труда							789,24		34 821,27
		эксплуатация машин и механизмов							168,59		2 419,27
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,12		1 020,06
		материалы							113 788,09		1 021 817,05
		накладные расходы							823,22		36 320,32
		сметная прибыль							410,36		18 104,86
		Перевозка							836,92		12 428,26
		Итого ФОТ (справочно)							812,36		35 841,33
		Итого накладные расходы (справочно)							823,22		36 320,32
		Итого сметная прибыль (справочно)							410,36		18 104,86
		<b>Итого по разделу 2 Монтаж памятника, плит</b>							<b>116 816,42</b>		<b>1 125 911,03</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							109 595,39		984 166,59
<b>Раздел 3. Облицовка фундамента под плиты, постаменты</b>											
16	ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Объем= $((0,24+0,28+0,24)*8,4) / 100$	100 м2			0,06384					
		1 ОТ						2 538,00	162,03	44,12	7 148,76
		2 ЭМ						47,72	3,05	14,35	43,77
		3 в т.ч. ОТм						17,45	1,11	44,12	48,97
		4 М						1 012,61	64,65	8,98	580,56
		ЗТ	чел.-ч	270		17,2368					
		ЗТм	чел.-ч	1,32		0,0842688					
		Итого по расценке						3 598,33	229,73		
		ФОТ							163,14		7 197,73
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	101		101			164,77		7 269,71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79,94		3 526,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>474,44</b>		<b>18 569,69</b>
17	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (Отделочные работы) Объем=0,4*8,4	м2			3,36		122,04	410,05	8,98	3 682,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>410,05</b>		<b>3 682,25</b>
18	ФССЦ-06.2.05.03-0006	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 400х400х9 мм (Отделочные работы) Объем=0,3*8,4*2	м2			5,04		212,28	1 069,89	8,98	9 607,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 069,89</b>		<b>9 607,61</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2			0,532					
		Объем=53,2 / 100									
		1 ОТ					1 081,00		575,09	44,12	25 372,97
		2 ЭМ					916,93		487,81	14,35	7 000,07
		3 в т.ч. ОТм					122,99		65,43	44,12	2 886,77
		4 М					0,24		0,13	8,98	1,17
		ЗТ	чел.-ч	115		61,18					
		ЗТм	чел.-ч	9,9		5,2668					
		Итого по расценке					1 998,17		1 063,03		
		ФОТ							640,52		28 259,74
	Пр/812-021.1-3	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			730,19		32 216,10
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			493,20		21 760,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 286,42</b>		<b>86 350,31</b>
20	ФССЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			2,88078	568,28		1 637,09	8,98	14 701,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 637,09</b>		<b>14 701,07</b>
21	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			0,28728	60,00		17,24	8,98	154,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17,24</b>		<b>154,82</b>
22	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			54,264	88,91		4 824,61	8,98	43 325,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 824,61</b>		<b>43 325,00</b>
23	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=40 / 100	100 м			0,4					
		1 ОТ					590,51		236,20	44,12	10 421,14
		2 ЭМ					73,02		29,21	14,35	419,16
		3 в т.ч. ОТм					8,70		3,48	44,12	153,54
		4 М					3 690,05		1 476,02	8,98	13 254,66
		ЗТ	чел.-ч	69,8		27,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,26					
		Итого по расценке					4 353,58		1 741,43		
		ФОТ							239,68		10 574,68
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148			354,73		15 650,53
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			321,17		14 170,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 417,33</b>		<b>53 915,56</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			40	63,12		2 524,80	8,98	22 672,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 524,80</b>		<b>22 672,70</b>
<b>Итого по разделу 3 Облицовка фундамента под плиты, постаменты :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							13 517,87		158 385,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							973,32		42 942,87
		Эксплуатация машин							520,07		7 463,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,02		3 089,28
		Материалы							12 024,48		107 979,84
		Строительные работы							15 661,87		252 979,01
		в том числе:									
		оплата труда							973,32		42 942,87
		эксплуатация машин и механизмов							520,07		7 463,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							70,02		3 089,28
		материалы							12 024,48		107 979,84
		накладные расходы							1 249,69		55 136,34
		сметная прибыль							894,31		39 456,96
		Итого ФОТ (справочно)							1 043,34		46 032,15
		Итого накладные расходы (справочно)							1 249,69		55 136,34
		Итого сметная прибыль (справочно)							894,31		39 456,96
		<b>Итого по разделу 3 Облицовка фундамента под плиты, постаменты</b>							<b>15 661,87</b>		<b>252 979,01</b>
<b>Раздел 4. Урны</b>											
25	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=0,1 / 100	100 м3			0,001					
		1 ОТ					2 184,00		2,18	44,12	96,18
		ЗТ	чел.-ч	280		0,28					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>2 184,00</b>		<b>2,18</b>		
		ФОТ							2,18		96,18
		Пр/812-001.2-3 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			1,96		86,56
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,87		38,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,01</b>		<b>221,21</b>
26	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,1 / 100	100 м3			0,001					
		1 ОТ					1 053,00		1,05	44,12	46,33
		2 ЭМ					1 566,06		1,57	14,35	22,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					244,39		0,24	44,12	10,59
		4 М					909,27		0,91	8,98	8,17
		ЗТ	чел.-ч	135		0,135					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,01812					
		Итого по расценке					3 528,33		3,53		
		ФОТ							1,29		56,92
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			1,33		58,63
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,75		33,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,61</b>		<b>168,67</b>
<b>27</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0003</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)</b> (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	<b>м3</b>			<b>0,102</b>	<b>560,00</b>		<b>57,12</b>	<b>8,98</b>	<b>512,94</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,12</b>		<b>512,94</b>
<b>28</b>	<b>ФЕР10-01-059-01</b>	<b>Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка скамеек, урн, прим.)</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,08</b>					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ					542,95		43,44	44,12	1 916,57
		2 ЭМ					216,38		17,31	14,35	248,40
		3 в т.ч. ОТм					52,01		4,16	44,12	183,54
		4 М					1 633,36		130,67	8,98	1 173,42
		ЗТ	чел.-ч	67,7		5,416					
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,336					
		Итого по расценке					2 392,69		191,42		
		ФОТ							47,60		2 100,11
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			51,88		2 289,12
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			26,18		1 155,06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>269,48</b>		<b>6 782,57</b>
<b>29</b>	<b>ТЦ_15.0.00.00_29_000000000</b> <b>0_09.08.2023_01</b>	<b>Урна садовая "Лотос под крышей" 450x400x670 мм</b>	<b>шт.</b>			<b>8</b>	<b>3 333,33</b>		<b>2 969,56</b>	<b>8,98</b>	<b>26 666,64</b>
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 969,56</b>		<b>26 666,64</b>
		<b>Итого по разделу 4 Урны :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 223,81		30 691,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							46,67		2 059,08
		Эксплуатация машин							18,88		270,93
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,40		194,13
		Материалы							3 158,26		28 361,17
		Строительные работы							3 306,78		34 352,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							46,67		2 059,08
		эксплуатация машин и механизмов							18,88		270,93
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,40		194,13
		материалы							3 158,26		28 361,17
		накладные расходы							55,17		2 434,31
		сметная прибыль							27,80		1 226,54
		Итого ФОТ (справочно)							51,07		2 253,21
		Итого накладные расходы (справочно)							55,17		2 434,31
		Итого сметная прибыль (справочно)							27,80		1 226,54
		<b>Итого по разделу 4 Урны</b>							<b>3 306,78</b>		<b>34 352,03</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							2 969,56		26 666,64
<b>Раздел 5. Освещение</b>											
30	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=10 / 100	100 шт			0,1					
		1 ОТ					304,01		30,40	44,12	1 341,25
		2 ЭМ					3 430,97		343,10	14,35	4 923,49
		3 в т.ч. ОТм					281,18		28,12	44,12	1 240,65
		4 М					233,10		23,31	8,98	209,32
		ЗТ	чел.-ч	35,64		3,564					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		2,248					
		Итого по расценке					3 968,08		396,81		
		ФОТ							58,52		2 581,90
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			55,01		2 426,99
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			36,28		1 600,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>488,10</b>		<b>10 501,83</b>
31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,634	560,00		355,04	8,98	3 188,26
		<b>Всего по позиции</b>							<b>355,04</b>		<b>3 188,26</b>
32	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Фонарь садовый с тремя светильниками "Ретро", высота 250 см (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			10	32 500,00		36 191,54	8,98	325 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 191,54</b>		<b>325 000,00</b>
33	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий	шт			10					
		1 ОТ					19,64		196,40	44,12	8 665,17
		2 ЭМ					99,23		992,30	14,35	14 239,51
		3 в т.ч. ОТм					9,55		95,50	44,12	4 213,46
		4 М					49,56		495,60	8,98	4 450,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,87		18,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		7,1					
		Итого по расценке					168,43		1 684,30		
		ФОТ							291,90		12 878,63
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			286,06		12 621,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			148,87		6 568,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 119,23</b>		<b>46 544,33</b>
<b>34</b>	<b>ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01</b>	<b>Уличный светильник</b>	<b>шт.</b>			<b>10</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 783,96</b>	<b>8,98</b>	<b>25 000,00</b>
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 783,96</b>		<b>25 000,00</b>
		<b>Итого по разделу 5 Освещение :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							41 411,65		387 017,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							226,80		10 006,42
		Эксплуатация машин							1 335,40		19 163,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							123,62		5 454,11
		Материалы							39 849,45		357 848,07
		Строительные работы							39 818,64		363 690,09
		в том числе:									
		оплата труда							30,40		1 341,25
		эксплуатация машин и механизмов							343,10		4 923,49
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							28,12		1 240,65
		материалы							39 353,85		353 397,58
		накладные расходы							55,01		2 426,99
		сметная прибыль							36,28		1 600,78
		Монтажные работы							2 119,23		46 544,33
		в том числе:									
		оплата труда							196,40		8 665,17
		эксплуатация машин и механизмов							992,30		14 239,51
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,50		4 213,46
		материалы							495,60		4 450,49
		накладные расходы							286,06		12 621,06
		сметная прибыль							148,87		6 568,10
		Итого ФОТ (справочно)							350,42		15 460,53
		Итого накладные расходы (справочно)							341,07		15 048,05
		Итого сметная прибыль (справочно)							185,15		8 168,88
		<b>Итого по разделу 5 Освещение</b>							<b>41 937,87</b>		<b>410 234,42</b>
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									38 975,50		350 000,00
<b>Раздел 6. Вечный огонь</b>											
35	ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3			0,0035					
		Объем=(7*0,5*1) / 1000									
		2 ЭМ					3 150,45		11,03	14,35	158,28
		3 в т.ч. ОТм					522,00		1,83	44,12	80,74
		ЗТм	чел.-ч	45		0,1575					
		Итого по расценке					3 150,45		11,03		
		ФОТ							1,83		80,74
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			1,70		75,09
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,84		37,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,57</b>		<b>270,51</b>
36	ФЕР24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм (диаметр 25 мм, прим.)	100 м			0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					180,30		12,62	44,12	556,79
		2 ЭМ					739,80		51,79	14,35	743,19
		3 в т.ч. ОТм					84,38		5,91	44,12	260,75
		4 М					3,70		0,26	8,98	2,33
		ЗТ	чел.-ч	20,1		1,407					
		ЗТм	чел.-ч	6,25		0,4375					
		Итого по расценке					923,80		64,67		
		ФОТ							18,53		817,54
	Пр/812-018.0-3	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			21,87		964,70
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			13,71		604,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,25</b>		<b>2 871,99</b>
37	ФССЦ-23.7.01.03-0003	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм	м			6	27,20		163,20	8,98	1 465,54
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>163,20</b>		<b>1 465,54</b>
38	ФЕР22-02-008-01	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм (диаметр 25 мм, прим.)	км			0,006					
		Объем=6/1000									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					745,58		4,47	44,12	197,22
		2 ЭМ					711,59		4,27	14,35	61,27
		3 в т.ч. ОТм					46,06		0,28	44,12	12,35
		4 М					7 856,39		47,14	8,98	423,32
		ЗТ	чел.-ч	78,4		0,4704					
		ЗТм	чел.-ч	3,31		0,01986					
		Итого по расценке					9 313,56		55,88		
		ФОТ							4,75		209,57
	Пр/812-018.0-3	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			5,61		247,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			3,52		155,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>65,01</b>		<b>1 084,18</b>
<b>39</b>	<b>ФССЦ-01.7.06.03-0002</b>	<b>Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм</b> (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	<b>м2</b>			<b>0,66</b>	<b>20,57</b>		<b>13,58</b>	<b>8,98</b>	<b>121,95</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,58</b>		<b>121,95</b>
<b>40</b>	<b>ФЕРм12-12-009-04</b>	<b>Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					46,18		46,18	44,12	2 037,46
		2 ЭМ					4,54		4,54	14,35	65,15
		4 М					7,64		7,64	8,98	68,61
		ЗТ	чел.-ч	4,8		4,8					
		Итого по расценке					58,36		58,36		
		ФОТ							46,18		2 037,46
	Пр/812-054.0-3	НР Технологические трубопроводы	%	91		91			42,02		1 854,09
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			21,24		937,23
		<b>Всего по позиции</b>							<b>121,62</b>		<b>4 962,54</b>
<b>41</b>	<b>ФССЦ-18.1.09.06-0023</b>	<b>Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое</b>  (Технологические трубопроводы)	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>33,28</b>		<b>33,28</b>	<b>8,98</b>	<b>298,85</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33,28</b>		<b>298,85</b>
<b>42</b>	<b>ФССЦ-23.8.03.07-0022</b>	<b>Соединения изолирующие (вставки диэлектрические) под приварку, для труб номинальным диаметром 25 мм</b> (Технологические трубопроводы)	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>422,32</b>		<b>844,64</b>	<b>8,98</b>	<b>7 584,87</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>844,64</b>		<b>7 584,87</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ФССЦ-23.8.03.12-0001	Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим.) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			2	63,00		126,00	8,98	1 131,48
<b>Всего по позиции</b>									<b>126,00</b>		<b>1 131,48</b>
44	ФЕР19-01-003-10	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более	шт			2					
		1 ОТ					338,47		676,94	44,12	29 866,59
		2 ЭМ					45,03		90,06	14,35	1 292,36
		3 в т.ч. ОТм					4,33		8,66	44,12	382,08
		4 М					1 637,70		3 275,40	8,98	29 413,09
		ЗТ	чел.-ч	30,52		61,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,7					
		Итого по расценке					2 021,20		4 042,40		
		ФОТ							685,60		30 248,67
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			836,43		36 903,38
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			493,63		21 779,04
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 372,46</b>		<b>119 254,46</b>
45	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Вечный огонь: газовая горелка (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			1	254 166,67		28 303,64	8,98	254 166,67
<b>Всего по позиции</b>									<b>28 303,64</b>		<b>254 166,67</b>
46	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Вечный огонь: звезда (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			1	245 833,33		27 375,65	8,98	245 833,33
<b>Всего по позиции</b>									<b>27 375,65</b>		<b>245 833,33</b>
<b>Итого по разделу 6 Вечный огонь :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							61 092,33		575 488,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							740,21		32 658,06
		Эксплуатация машин							161,69		2 320,25
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16,68		735,92
		Материалы							60 190,43		540 510,04
		Строительные работы							61 533,36		626 200,11
		в том числе:									
		оплата труда							694,03		30 620,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							157,15		2 255,10
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,68		735,92
		материалы							59 304,87		532 557,71
		накладные расходы							865,61		38 190,46
		сметная прибыль							511,70		22 576,24
		Монтажные работы							999,54		12 846,26
		в том числе:									
		оплата труда							46,18		2 037,46
		эксплуатация машин и механизмов							4,54		65,15
		материалы							885,56		7 952,33
		накладные расходы							42,02		1 854,09
		сметная прибыль							21,24		937,23
		Итого ФОТ (справочно)							756,89		33 393,98
		Итого накладные расходы (справочно)							907,63		40 044,55
		Итого сметная прибыль (справочно)							532,94		23 513,47
		<b>Итого по разделу 6 Вечный огонь</b>							<b>62 532,90</b>		<b>639 046,37</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							55 679,29		500 000,00
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							237 983,35		2 290 435,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 486,61		153 829,22
		Эксплуатация машин							2 511,51		36 040,18
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							240,89		10 628,07
		Материалы							229 031,38		2 056 701,79
		Перевозка							2 953,85		43 864,67
		Строительные работы							241 368,60		2 518 002,80
		Строительные работы							238 414,75		2 474 138,13
		в том числе:									
		оплата труда							3 244,03		143 126,59
		эксплуатация машин и механизмов							1 514,67		21 735,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							145,39		6 414,61
		материалы							227 650,22		2 044 298,97
		накладные расходы							3 733,03		164 701,09
		сметная прибыль							2 272,80		100 275,96
		Перевозка							2 953,85		43 864,67
		Монтажные работы							3 118,77		59 390,59
		в том числе:									
		оплата труда							242,58		10 702,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							996,84		14 304,66
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,50		4 213,46
		материалы							1 381,16		12 402,82
		накладные расходы							328,08		14 475,15
		сметная прибыль							170,11		7 505,33
		<b>Итого</b>							<b>244 487,37</b>		<b>2 577 393,39</b>
		Итого ФОТ (справочно)							3 727,50		164 457,29
		Итого накладные расходы (справочно)							4 061,11		179 176,24
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 442,91		107 781,29
		Непредвиденные затраты 2%							4 889,75		51 547,87
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>249 377,12</b>		<b>2 628 941,26</b>
		НДС 20%							49 875,42		525 788,25
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>299 252,54</b>		<b>3 154 729,51</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							207 219,74		1 860 833,23

Составил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

# ПРОТОКОЛ

## схода, собрания или конференции граждан

П. Кизема  
(место проведения)

«25» августа 2023 г.

Время проведения собрания: 15 00 часов.

Организатор:

Секретарь: Царькова Т. В.

Присутствовали: 10 (десять) (список прилагается)  
(общее количество человек)

Собрание созвано по инициативе Чупровой Галиной Дмитриевной

### Повестка дня

О выдвижении инициативного проекта «Парк Победы» для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

#### Слушали:

Гордиенко Вячеслава Николаевича заведующий КТО

В срок до «31» августа 2023 года осуществляется прием инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В этой связи предлагаю к рассмотрению и выдвижению для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета инициативный проект

«Парк Победы»

наименование инициативного проекта

Установка памятных плит с ФИО героев и тружеников тыла, в количестве 10 парных плит и одной центральной, установка МАФов (урны, фонари уличные, фонари подсветки)

(краткое описание проекта)

Голосовали: «за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

#### Решили:

Признать Целесообразным

(целесообразным/нецелесообразным)

и соответствующим интересам  
(соответствующим/несоответствующим)









жителей инициативный проект Парк Победы

и поддержать выдвижение инициативного проекта  
(поддержать/не поддерживать)

Парк Победы для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных


проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».  
Инициатор проекта (его представитель): Чупрова Галина Дмитриевна

**Список лиц, присутствовавших на сходе, собрании или конференции граждан**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактный телефон	Подпись*
1	Чупрова Галина Дмитриевна	+79210838951	
2	Царьков Анатолий Михайлович	+79214875992	
3	Каймакова Екатерина Анатольевна	+79214933701	
4	Краснова Ирина Николаевна	+79214852746	
5	Царькова Татьяна Викторовна	+79815575301	
6	Шаповолова Екатерина Ильинична	+79214971817	
7	Ипатова Ирина Михайловна	+79115873234	
8	Царьков Юрий Анатольевич	+79116887143	
9	Гордиенко Вячеслав Николаевич	+79314036053	
10	Нестеренко Виктор Владимирович	+79214804008	

\* Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в таблице, и совершение всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» инициатором проекта, администрацией Устьянского муниципального округа Архангельской области,

(наименование муниципального образования Архангельской области)  
администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях рассмотрения, оценки и отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем представления заявления в простой письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных.

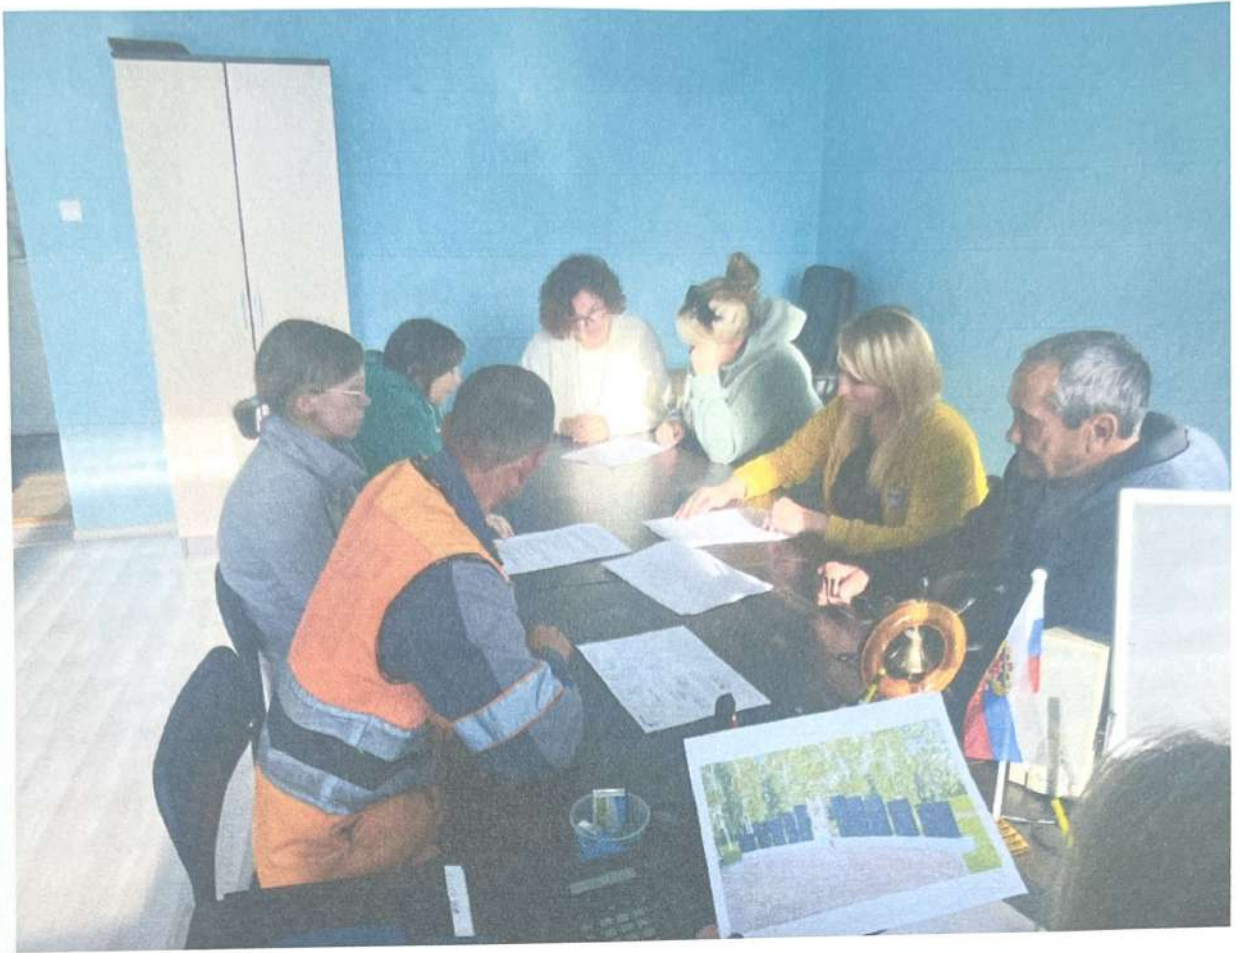

Администрация Устьянского муниципального округа  
Архангельской области

Разрешение на использование земли  
без предоставления земельного участка  
№ 91 от 03.10.2023

**Выдано:** Администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области, ИНН 2922001477, ОГРН 1022901534974, юридический адрес: 165210 Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7

**Основание:** постановление администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 03.10.2023 года № 2288 «Об использовании земли без предоставления земельного участка» администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области.

**Объект:** земельный участок в кадастровом квартале 29:18:150107, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: участок находится примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский район, МО "Киземское", п. Кизема, пер. Детский, д. 2, площадью 2460 кв.м.

**Координаты:**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	267485	3443085
2	267499	3443131
3	267480	3443135
4	267472	3443136
5	267468	3443132
6	267441	3443139
7	267432	3443100
1	267485	3443085

**Приложение:** схема границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:150107.

**Цель использования земли:** для размещения зоны отдыха и парка Победы.

**Срок действия разрешения:** на период размещения зоны отдыха и парка Победы.

**Обязанности лица, использующего земли (в случае, если использование земли привело к порче, либо плодородного слоя земли):**

- привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием;

- выполнить необходимые работы по рекультивации.

Администрация Устьянского муниципального округа обязана использовать землю в указанных целях, на указанных участках запрещено строительство объектов капитального строительства.

**Особые условия:**

- действие разрешения на использование земель прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу;

Приложение: схема границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:150107 – 1 л.

Исполняющий обязанности главы  
Устьянского муниципального округа



Н.С. Филимонова



Условный номер земельного участка	29:18:150107:ЗУ1
Площадь земельного участка	2460 м <sup>2</sup>

29:18:150107

ул. Дачная

Масштаб 1: 1500

**Условные обозначения:**

- 29:18:150107 - обозначение кадастрового квартала
- :ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
- - граница образуемого земельного участка
- - граница существующего земельного участка

Система координат МСК-29

14 кустов

**ВЫПИСКА**  
**из реестра имущества Устьянского муниципального округа**  
**Архангельской области**

«14» сентября 2023 г.

Настоящая выписка из реестра имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области содержит сведения об объекте: сооружение "Памятник воинам ВОВ"

4-010119		24.01.2023
(реестровый номер имущества)		(дата присвоения реестрового номера)
внесенные в реестр имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области и имеющие следующие значения:		
№ п/п	Наименование сведений	Значение сведений
Сведения об объекте учета		
1	Кадастровый (условный номер) от	
2	Номер регистрации права собственности от	
3	Адрес (местоположение)	, 165262, Архангельская обл, Устьянский р-н, п Кизема, пер Детский
4	Документы-основания возникновения права собственности:	
5	Документы-основания возникновения права:	Закон субъекта Российской Федерации О преобразовании городского и сельских поселений Устьянского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Устьянского муниципального округа Архангельской области от 23.09.2022 г. № 593-37-ОЗ; Акт приема - передачи муниципального имущества Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности сельского поселения "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области, передаваемого в собственность Устьянского муниципального округа Архангельской области от 24.01.2023 г. № -;
6	Площадь (кв. м)	
7	Категория земель	
8	Вид разрешенного использования	
9	Кадастровая стоимость (тыс. руб.)	0,00
10	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	29 000,00
11	Остаточная стоимость (тыс. руб.)	0,00
12	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения об объекте учета	

Сведения о правообладателе объекта учета		
1	Полное наименование правообладателя, номер регистрации права	Устьянский муниципальный округ Архангельской области,  Казна
2	Адрес (место нахождения) правообладателя	165210, Архангельская обл, Устьянский р-н, Октябрьский рп, Комсомольская ул, д.7
3	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения о лицах, обладающих правами на имущество и сведения о нем	
Сведения о прекращении права собственности и исключения объекта учета из реестра имущества		
1	Документы-основания прекращения права собственности и исключения из реестра имущества	
2	Дата исключения из реестра имущества	

Председатель КУМИ администрации  
Устьянского муниципального округа

(должность)



(подпись)  
М.П.

Н. В. Чеснокова

(Ф.И.О.)
