

№4
30.08.23
в 13:50
130 подп.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

З А Я В К А

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

«Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют», предполагаемый к реализации на территории Устьянского муниципального округа.

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) *Ибрагимова Надежда Васильевна 8 921 084 9428*

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: *деревня Левоплоская Устьянский муниципальный округ.*

3. Наименование (направление) инициативного проекта: *Проект «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют»- направлен на благоустройство общественных пространств.*

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

В течении ряда лет, в деревне Левоплоская, сформировалась территория для проведения съезжего деревенского праздника под общим названием «Деревенское раздолье». На праздник приходят все жители окрестных деревень, приезжают наши земляки из разных уголков не только района, но и из других территорий.

Постепенно наш праздник «Деревенское раздолье» становится объединяющим событием по сохранению и развитию традиций гостеприимства и дружеского общения. В рамках деревенского праздника, проводится межтерриториальный конкурс «А ушца хоть куда», это позволяет сохранить народные традиции и рецепты по приготовлению ухи, и сохранить преемственность кулинарных деревенских традиций.

На наш праздник приходят и приезжают целыми семьями.

Все эти положительные и объединяющие мероприятия привели нас к идее расширить и окультурить территорию проведения деревенского праздника и создать Парк отдыха под названием «Деревенское раздолье».

Вместе с тем, территория зарастает кустарником, участники конкурса «А ушница хоть куда» не имеют одинаковых условий для участия в конкурсе, футбольное поле и волейбольная площадка не ровные, что приводит к травмам игроков, фотовыставки оформляются на самодельных щитах из досок, нет места для семейного отдыха и общения, отсутствует подъезд и место для парковки транспорта.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют»:

С целью создания условий для комфортного отдыха и безопасного проведения мероприятий, мы считаем необходимым расчистить территорию от кустарника, приобрести палатки шатрового типа, для удобства участникам конкурса «А ушница хоть куда»- создав равные условия конкурсантам, изготовить специальные щиты для фотовыставок. Выравнивать территорию футбольного поля. Оборудовать площадку для пляжного волейбола. Для удобства и комфортного семейного общения, и отдыха обустроить 3 крытые беседки, отсыпать гравием подъездные пути и парковочное место для транспорта с общественным туалетом. Установить вывеску Парк отдыха «Деревенское раздолье».

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта.

В результате реализации проекта «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют» появится благоустроенный, комфортный парк отдыха для населения и создаст условия проведения мероприятий различной направленности, что позволит улучшить социальную обстановку, сформировать имидж, как комфортной для проживания территории, увеличит ее привлекательность. Совместные мероприятия по благоустройству парка, объединят население на дальнейшие добрые дела.

Предполагаемый срок эксплуатации результатов проекта- 10 лет.

Количество благополучателей- 350 человек.

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: *Локальный сметный расчет.*

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: *10(Десять) человек.*

9. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме проекта (процентов)
1	2	3	4
1	Средства областного бюджета	2119,157	90
2	Средства местного бюджета	117,731	5
3	Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет	117,731	5
4	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет		
5	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта		
Всего		2 354, 619	100

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: *31 октября 2024 г.*

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: *в Устьянском муниципальном округе примерно проживает 23 600 человек.*

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).
На территории деревень Левоплоская, Левогорочная, Правоплоская, Михеевская, Карповская, Пирятинская, Исаевская проживает 350 человек.


«29» августа 2023 г. Ибраш

Ибрагимова Надежда Васильевна







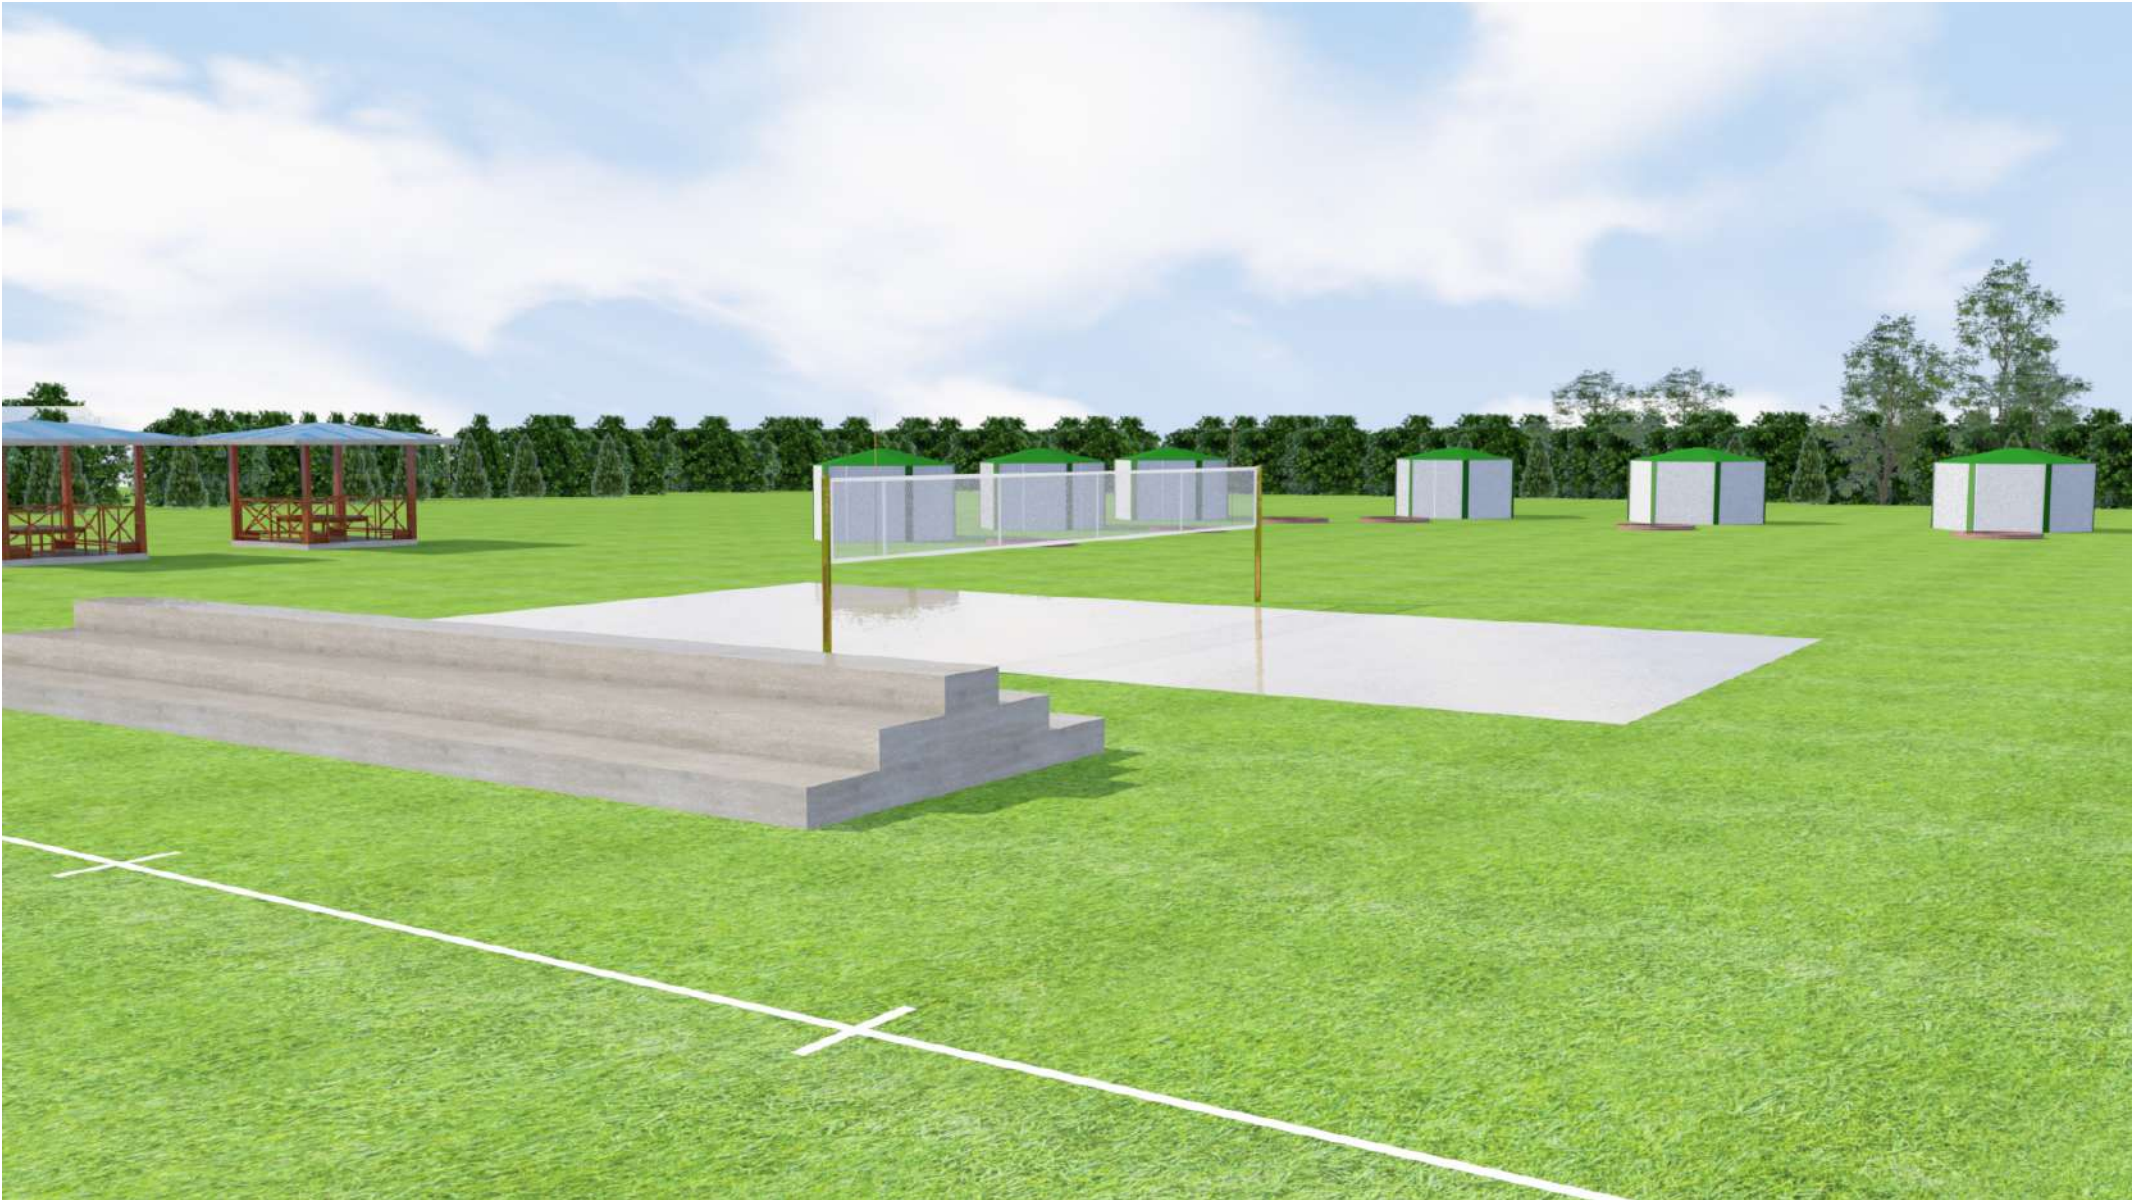



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Стоянка											
1	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(30*30*0,2) / 1000	1000 м3	0,18	1	0,18					
		2 ЭМ					940,50		169,29	14,35	2 429,31
		3 в т.ч. ОТм					135,00		24,30	44,12	1 072,12
		ЗТм	чел.-ч	10		1,8					
		Итого по расценке					940,50		169,29		2 429,31
		ФОТ							24,30		1 072,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			22,60		997,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			11,18		493,18
		Всего по позиции							203,07		3 919,56
2	ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 Объем=(30*30*0,3) / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м3	0,27	1	0,27					
		2 ЭМ					426,19	2	230,14	14,35	3 302,51
		3 в т.ч. ОТм					72,77	2	39,30	44,12	1 733,92
		ЗТм	чел.-ч	5,39	2	2,9106					
		Итого по расценке					426,19		230,14		3 302,51
		ФОТ							39,30		1 733,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			36,55		1 612,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			18,08		797,60
		Всего по позиции							284,77		5 712,66
3	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=30*30*0,2*1,45	1 т груза	261	1	261	3,96		1 033,56	8,98	9 281,37
		Всего по позиции							1 033,56		9 281,37
4	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	261	1	261	6,69		1 746,09	14,85	25 929,44
		Всего по позиции							1 746,09		25 929,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	2,7	1	2,7					
		Объем=270 / 100									
		1 ОТ					115,49		311,82	44,12	13 757,50
		2 ЭМ					3 357,76		9 065,95	14,35	130 096,38
		3 в т.ч. ОТм					181,59		490,29	44,12	21 631,59
		4 М					17,08		46,12	8,98	414,16
		ЗТ	чел.-ч	14,4		38,88					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		39,987					
		Итого по расценке					3 490,33		9 423,89		144 268,04
		ФОТ							802,11		35 389,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1 187,12		52 375,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 074,83		47 421,38
		Всего по позиции							11 685,84		244 065,27
6	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	329,4	1	329,4	60,00		19 764,00	8,98	177 480,72
		Объем=270*1,22									
		Всего по позиции							19 764,00		177 480,72
7	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,9	1	0,9					
		Объем=(30*30) / 1000									
		2 ЭМ					94,97		85,47	14,35	1 226,49
		3 в т.ч. ОТм					13,37		12,03	44,12	530,76
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,891					
		Итого по расценке					94,97		85,47		1 226,49
		ФОТ							12,03		530,76
	Пр/812-001.4-3	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			10,83		477,68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,93		217,61
		Всего по позиции							101,23		1 921,78
		Итого по разделу 1 Стоянка :									
		Итого прямые затраты (справочно)							32 452,44		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							311,82		
		Эксплуатация машин							9 550,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							565,92		
		Материалы							20 843,68		
		Перевозка							1 746,09		
		Строительные работы							34 818,56		
		Строительные работы							33 072,47		
		в том числе:									
		оплата труда							311,82		
		эксплуатация машин и механизмов							9 550,85		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							565,92		
		материалы							20 843,68		
		накладные расходы							1 257,10		
		сметная прибыль							1 109,02		
		Перевозка							1 746,09		
		Итого ФОТ (справочно)							877,74		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 257,10		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 109,02		
		Итого по разделу 1 Стоянка							34 818,56		
Раздел 2. Устройство водопропускной трубы											
8	ФЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00375	1	0,00375					
		Объем=(15*0,5*0,5) / 1000									
		1 ОТ					8 785,90		32,95	44,12	1 453,75
		2 ЭМ					1 450,29		5,44	14,35	78,06
		3 в т.ч. ОТм					179,01		0,67	44,12	29,56
		ЗТ	чел.-ч	1030		3,8625					
		ЗТм	чел.-ч	13,26		0,049725					
		Итого по расценке					10 236,19		38,39		1 531,81
		ФОТ							33,62		1 483,31
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93		31,27		1 379,48
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		15,47		682,32
		Всего по позиции							85,13		3 593,61
9	ФЕР27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					521,16		31,27	44,12	1 379,63
		2 ЭМ					25,43		1,53	14,35	21,96
		3 в т.ч. ОТм					2,95		0,18	44,12	7,94
		4 М					2 269,32		136,16	8,98	1 222,72
		ЗТ	чел.-ч	58,1		3,486					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0138					
		Итого по расценке					2 815,91		168,96		2 624,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							31,45		1 387,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			46,55		2 053,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			42,14		1 859,34
		Всего по позиции							257,65		6 537,25
10	24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 100 мм (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	м	-6,12	1	-6,12	14,74		-90,21	8,98	-810,09
		Всего по позиции							-90,21		-810,09
11	ФССЦ-24.3.03.06-0027	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	м	6	1	6	347,54		2 085,24	8,98	18 725,46
		Всего по позиции							2 085,24		18 725,46
Итого по разделу 2 Устройство водопропускной трубы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 202,38		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							64,22		
		Эксплуатация машин							6,97		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,85		
		Материалы							2 131,19		
		Строительные работы							2 337,81		
		в том числе:									
		оплата труда							64,22		
		эксплуатация машин и механизмов							6,97		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,85		
		материалы							2 131,19		
		накладные расходы							77,82		
		сметная прибыль							57,61		
		Итого ФОТ (справочно)							65,07		
		Итого накладные расходы (справочно)							77,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							57,61		
		Итого по разделу 2 Устройство водопропускной трубы							2 337,81		
Раздел 3. Футбольное поле											
12	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(18*36) / 1000	1000 м2	0,648	1	0,648					
		2 ЭМ							94,97	61,54	14,35
		3 в т.ч. ОТм							13,37	8,66	44,12
											883,10
											382,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,64152					
		Итого по расценке					94,97		61,54		883,10
		ФОТ							8,66		382,08
	Пр/812-001.4-3	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			7,79		343,87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,55		156,65
		Всего по позиции							72,88		1 383,62
		Итого по разделу 3 Футбольное поле :									
		Итого прямые затраты (справочно)							61,54		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							61,54		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,66		
		Строительные работы							72,88		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							61,54		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,66		
		накладные расходы							7,79		
		сметная прибыль							3,55		
		Итого ФОТ (справочно)							8,66		
		Итого накладные расходы (справочно)							7,79		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3,55		
		Итого по разделу 3 Футбольное поле							72,88		
Раздел 4. Волейбольная площадка											
13	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(20*10*0,3) / 100	100 м3	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					115,49		69,29	44,12	3 057,07
		2 ЭМ					3 262,79		1 957,67	14,35	28 092,56
		3 в т.ч. ОТм					171,22		102,73	44,12	4 532,45
		4 М					12,20		7,32	8,98	65,73
		ЗТ	чел.-ч	14,4		8,64					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		8,328					
		Итого по расценке					3 390,48		2 034,28		31 215,36
		ФОТ							172,02		7 589,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			254,59		11 232,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			230,51		10 169,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 519,38		52 617,81
14	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=60*1,11	м3	66,6	1	66,6	55,26		3 680,32	8,98	33 049,27
		Всего по позиции							3 680,32		33 049,27
Итого по разделу 4 Волейбольная площадка :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 714,60		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							69,29		
		Эксплуатация машин							1 957,67		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							102,73		
		Материалы							3 687,64		
		Строительные работы							6 199,70		
		в том числе:									
		оплата труда							69,29		
		эксплуатация машин и механизмов							1 957,67		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							102,73		
		материалы							3 687,64		
		накладные расходы							254,59		
		сметная прибыль							230,51		
		Итого ФОТ (справочно)							172,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							254,59		
		Итого сметная прибыль (справочно)							230,51		
		Итого по разделу 4 Волейбольная площадка							6 199,70		
Раздел 5. Трибуны											
15	ФЕР10-01-010-02	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	м3	4,3	1	4,3					
		1 ОТ					168,44		724,29	44,12	31 955,67
		2 ЭМ					24,97		107,37	14,35	1 540,76
		3 в т.ч. Отм					4,41		18,96	44,12	836,52
		4 М					804,19		3 458,02	8,98	31 053,02
		ЗТ	чел.-ч	20,1		86,43					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		1,634					
		Итого по расценке					997,60		4 289,68		64 549,45
		ФОТ							743,25		32 792,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109		810,14		35 743,49
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		408,79		18 035,70
		Всего по позиции							5 508,61		118 328,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного Объем=27 / 100	100 м2	0,27	1	0,27					
		1 ОТ					249,09		67,25	44,12	2 967,07
		2 ЭМ					134,64		36,35	14,35	521,62
		3 в т.ч. ОТм					17,57		4,74	44,12	209,13
		4 М					6 147,56		1 659,84	8,98	14 905,36
		ЗТ	чел.-ч	28,5		7,695					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,3726					
		Итого по расценке					6 531,29		1 763,44		18 394,05
		ФОТ							71,99		3 176,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			78,47		3 462,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			39,59		1 746,91
		Всего по позиции							1 881,50		23 603,02
		Итого по разделу 5 Трибуны :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 053,12		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							791,54		
		Эксплуатация машин							143,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,70		
		Материалы							5 117,86		
		Строительные работы							7 390,11		
		в том числе:									
		оплата труда							791,54		
		эксплуатация машин и механизмов							143,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,70		
		материалы							5 117,86		
		накладные расходы							888,61		
		сметная прибыль							448,38		
		Итого ФОТ (справочно)							815,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							888,61		
		Итого сметная прибыль (справочно)							448,38		
		Итого по разделу 5 Трибуны							7 390,11		
Раздел 6. Вырубка кустарника											
17	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Объем=10000 / 100	100 м2	100	1	100					
		1 ОТ					37,79		3 779,00	44,12	166 729,48
		ЗТ	чел.-ч	4,43		443					
		Итого по расценке					37,79		3 779,00		166 729,48
		ФОТ							3 779,00		166 729,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.4-3	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			3 401,10		150 056,53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1 549,39		68 359,09
		Всего по позиции							8 729,49		385 145,10
18	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	1	1	42,98		42,98	14,35	616,76
		Всего по позиции							42,98		616,76
19	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	1	1	1	6,69		6,69	14,85	99,35
		Всего по позиции							6,69		99,35
Итого по разделу 6 Вырубка кустарника :											
Итого прямые затраты (справочно)									3 828,67		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 779,00		
Эксплуатация машин									42,98		
Перевозка									6,69		
Строительные работы									8 779,16		
Строительные работы									8 772,47		
в том числе:											
оплата труда									3 779,00		
эксплуатация машин и механизмов									42,98		
накладные расходы									3 401,10		
сметная прибыль									1 549,39		
Перевозка									6,69		
Итого ФОТ (справочно)									3 779,00		
Итого накладные расходы (справочно)									3 401,10		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 549,39		
Итого по разделу 6 Вырубка кустарника									8 779,16		
Раздел 7. Беседка (3 шт.)											
20	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев Объем=1,5*3	м3	4,5	1	4,5					
		1 ОТ					188,55		848,48	44,12	37 434,94
		2 ЭМ					23,66		106,47	14,35	1 527,84
		3 в т.ч. ОТм					4,18		18,81	44,12	829,90
		4 М					2 191,54		9 861,93	8,98	88 560,13
		ЗТ	чел.-ч	22,5		101,25					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		1,62					
		Итого по расценке					2 403,75		10 816,88		127 522,91
		ФОТ							867,29		38 264,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			945,35		41 708,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			477,01		21 045,66
		Всего по позиции							12 239,24		190 277,25
21	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	6	1	6					
		Объем=2*3									
		1 ОТ						197,78	1 186,68	44,12	52 356,32
		2 ЭМ						31,77	190,62	14,35	2 735,40
		3 в т.ч. ОТм						4,58	27,48	44,12	1 212,42
		4 М						2 068,16	12 408,96	8,98	111 432,46
		ЗТ	чел.-ч	23,8		142,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		2,22					
		Итого по расценке						2 297,71	13 786,26		166 524,18
		ФОТ							1 214,16		53 568,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			1 323,43		58 389,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			667,79		29 462,81
		Всего по позиции							15 777,48		254 376,92
22	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,27	1	0,27					
		Объем=(9*3) / 100									
		1 ОТ						454,46	122,70	44,12	5 413,52
		2 ЭМ						51,99	14,04	14,35	201,47
		3 в т.ч. ОТм						7,80	2,11	44,12	93,09
		4 М						4 156,30	1 122,20	8,98	10 077,36
		ЗТ	чел.-ч	52,6		14,202					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,1728					
		Итого по расценке						4 662,75	1 258,94		15 692,35
		ФОТ							124,81		5 506,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			136,04		6 002,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			68,65		3 028,64
		Всего по позиции							1 463,63		24 723,19
23	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,357	1	0,357					
		Объем=(11,9*3) / 100									
		1 ОТ						155,54	55,53	44,12	2 449,98
		2 ЭМ						22,48	8,03	14,35	115,23
		3 в т.ч. ОТм						6,52	2,33	44,12	102,80
		4 М						1 295,94	462,65	8,98	4 154,60
		ЗТ	чел.-ч	19,59		6,99363					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		0,18207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 473,96		526,21		6 719,81
		ФОТ							57,86		2 552,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			52,65		2 323,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			26,62		1 174,28
		Всего по позиции							605,48		10 217,12
24	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,357	1	0,357					
		Объем=(11,9*3) / 100									
		1 ОТ					283,18		101,10	44,12	4 460,53
		2 ЭМ					28,03		10,01	14,35	143,64
		3 в т.ч. ОТм					4,04		1,44	44,12	63,53
		4 М					57,28		20,45	8,98	183,64
		ЗТ	чел.-ч	32,4		11,5668					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,11424					
		Итого по расценке					368,49		131,56		4 787,81
		ФОТ							102,54		4 524,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			112,79		4 976,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			58,45		2 578,71
		Всего по позиции							302,80		12 342,99
25	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (Кровли)	м2	43,554	1	43,554	79,64		3 468,64	8,98	31 148,39
		Объем=35,7*1,22									
		Всего по позиции							3 468,64		31 148,39
26	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,27	1	0,27					
		Объем=(9*3) / 100									
		1 ОТ					466,59		125,98	44,12	5 558,24
		2 ЭМ					78,97		21,32	14,35	305,94
		3 в т.ч. ОТм					17,57		4,74	44,12	209,13
		4 М					6 356,61		1 716,28	8,98	15 412,19
		ЗТ	чел.-ч	54,7		14,769					
		ЗТм	чел.-ч	1,42		0,3834					
		Итого по расценке					6 902,17		1 863,58		21 276,37
		ФОТ							130,72		5 767,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			147,71		6 517,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			84,97		3 748,79
		Всего по позиции							2 096,26		31 542,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=(10*3) / 100	100 м2	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					75,25		22,58	44,12	996,23
		2 ЭМ					61,87		18,56	14,35	266,34
		3 в т.ч. ОТм					2,32		0,70	44,12	30,88
		4 М					1,84		0,55	8,98	4,94
		ЗТ	чел.-ч	8,98		2,694					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,06					
		Итого по расценке					138,96		41,69		1 267,51
		ФОТ							23,28		1 027,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			25,38		1 119,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			12,80		564,91
		Всего по позиции							79,87		2 951,97
28	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции) Объем=4,14/1000	т	0,00414	1	0,00414	37 565,22		155,52	8,98	1 396,57
		Всего по позиции							155,52		1 396,57
		Итого по разделу 7 Беседка (3 шт.) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							32 049,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 463,05		
		Эксплуатация машин							369,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							57,61		
		Материалы							29 217,18		
		Строительные работы							36 188,92		
		в том числе:									
		оплата труда							2 463,05		
		эксплуатация машин и механизмов							369,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							57,61		
		материалы							29 217,18		
		накладные расходы							2 743,35		
		сметная прибыль							1 396,29		
		Итого ФОТ (справочно)							2 520,66		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 743,35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 396,29		
		Итого по разделу 7 Беседка (3 шт.)							36 188,92		
Раздел 8. Шатер											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТЦ_15.0.00.00_29_00000000 0_09.08.2023_01	Шатер садовый с каркасом для отдыха и защиты от солнца (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	6	1	6	10 226,67		6 832,96	8,98	61 360,02
Всего по позиции									6 832,96		61 360,02
Итого по разделу 8 Шатер :											
Итого прямые затраты (справочно)									6 832,96		
в том числе:											
Материалы									6 832,96		
Строительные работы									6 832,96		
в том числе:											
материалы									6 832,96		
Итого по разделу 8 Шатер									6 832,96		
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 832,96		
Раздел 9. Установка скамей 5 шт.											
30	ФЕР40-01-001-01	Рубка ряжей из бревен: насухо на месте установки (прим.)	м3	1,5	1	1,5					
		1 ОТ					171,45		257,18	44,12	11 346,78
		2 ЭМ					205,74		308,61	14,35	4 428,55
		3 в т.ч. ОТм					24,44		36,66	44,12	1 617,44
		4 М					891,71		1 337,57	8,98	12 011,38
		ЗТ	чел.-ч	20,1		30,15					
		ЗТм	чел.-ч	1,81		2,715					
Итого по расценке							1 268,90		1 903,36		27 786,71
ФОТ									293,84		12 964,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.34	НР Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	110	110			323,22		14 260,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.34	СП Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	49	49			143,98		6 352,47
Всего по позиции									2 370,56		48 399,82
31	ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (прим.) Объем=6,48 / 100	100 м2	0,0648	1	0,0648					
		1 ОТ					249,09		16,14	44,12	712,10
		2 ЭМ					134,64		8,72	14,35	125,13
		3 в т.ч. ОТм					17,57		1,14	44,12	50,30
		4 М					6 147,56		398,36	8,98	3 577,27
		ЗТ	чел.-ч	28,5		1,8468					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,089424					
Итого по расценке							6 531,29		423,22		4 414,50
ФОТ									17,28		762,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109	109			18,84		831,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			9,50		419,32	
	Всего по позиции								451,56		5 664,84	
	Итого по разделу 9 Установка скамей 5 шт. :											
	Итого прямые затраты (справочно)									2 326,58		
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих									273,32		
	Эксплуатация машин									317,33		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
	Материалы									1 735,93		
	Строительные работы									2 822,12		
	в том числе:											
	оплата труда									273,32		
	эксплуатация машин и механизмов									317,33		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
	материалы									1 735,93		
	накладные расходы									342,06		
	сметная прибыль									153,48		
	Итого ФОТ (справочно)									311,12		
	Итого накладные расходы (справочно)									342,06		
	Итого сметная прибыль (справочно)									153,48		
	Итого по разделу 9 Установка скамей 5 шт.									2 822,12		
Раздел 10. Информационный щит												
32	ФЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих (информационный щит, прим.) Объем=(2*1) / 100	100 м2	0,02	1	0,02						
		1 ОТ					1 506,20		30,12	44,12	1 328,89	
		2 ЭМ					756,20		15,12	14,35	216,97	
		3 в т.ч. ОТм					88,86		1,78	44,12	78,53	
		4 М					7 037,72		140,75	8,98	1 263,94	
		ЗТ	чел.-ч	170		3,4						
		ЗТм	чел.-ч	6,72		0,1344						
		Итого по расценке							9 300,12	185,99		2 809,80
		ФОТ									31,90	1 407,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			34,77		1 534,09	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			17,55		774,08	
	Всего по позиции								238,31		5 117,97	
33	ТЦ_15.0.00.00_29_00000000 0_09.08.2023_01	Информационный стенд	шт.	1	1	1	9 166,67		1 020,79	8,98	9 166,67	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
	Всего по позиции									1 020,79	9 166,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 10 Информационный щит :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 206,78		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							30,12		
		Эксплуатация машин							15,12		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,78		
		Материалы							1 161,54		
		Строительные работы							1 259,10		
		в том числе:									
		оплата труда							30,12		
		эксплуатация машин и механизмов							15,12		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,78		
		материалы							1 161,54		
		накладные расходы							34,77		
		сметная прибыль							17,55		
		Итого ФОТ (справочно)							31,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							34,77		
		Итого сметная прибыль (справочно)							17,55		
		Итого по разделу 10 Информационный щит							1 259,10		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 020,79		
Раздел 11. Уличный туалет											
34	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Объем=3,5 / 1000	1000 м3	0,0035	1	0,0035					
		1 ОТ					80,65		0,28	44,12	12,35
		2 ЭМ					4 139,95		14,49	14,35	207,93
		3 в т.ч. ОТм					394,34		1,38	44,12	60,89
		4 М					13,01		0,05	8,98	0,45
		ЗТ	чел.-ч	10,34		0,03619					
		ЗТм	чел.-ч	29,21		0,102235					
		Итого по расценке					4 233,61		14,82		220,73
		ФОТ							1,66		73,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93		1,54		68,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		0,76		33,69
		Всего по позиции							17,12		322,53
35	ФССЦпг-03-21-01-114	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 114 км	1 т груза	5,075	1	5,075	52,35		265,68	14,85	3 945,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,5*1,45									
		Всего по позиции							265,68		3 945,35
36	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах Объем=(0,271*4) / 10	10 м3	0,1084	1	0,1084					
		1 ОТ					1 257,92		136,36	44,12	6 016,20
		2 ЭМ					2 297,79		249,08	14,35	3 574,30
		3 в т.ч. ОТм					286,34		31,04	44,12	1 369,48
		4 М					3 018,09		327,16	8,98	2 937,90
		ЗТ	чел.-ч	138,69		15,033996					
		ЗТм	чел.-ч	21,87		2,370708					
		Итого по расценке					6 573,80		712,60		12 528,40
		ФОТ							167,40		7 385,68
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			197,53		8 715,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			123,88		5 465,40
		Всего по позиции							1 034,01		26 708,90
37	ФССЦ-05.1.01.09-0014	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,271 м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,59*4	м	2,36	1	2,36	411,76		971,75	8,98	8 726,32
		Всего по позиции							971,75		8 726,32
38	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,4*0,4*0,4*6) / 100	100 м3	0,00384	1	0,00384					
		1 ОТ					1 053,00		4,04	44,12	178,24
		2 ЭМ					1 566,06		6,01	14,35	86,24
		3 в т.ч. ОТм					244,39		0,94	44,12	41,47
		4 М					909,27		3,49	8,98	31,34
		ЗТ	чел.-ч	135		0,5184					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,0695808					
		Итого по расценке					3 528,33		13,54		295,82
		ФОТ							4,98		219,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			5,13		226,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2,89		127,43
		Всего по позиции							21,56		649,55
39	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,39168	1	0,39168	490,00		191,92	8,98	1 723,44
		Всего по позиции							191,92		1 723,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					188,55		150,84	44,12	6 655,06
		2 ЭМ					23,66		18,93	14,35	271,65
		3 в т.ч. ОТм					4,18		3,34	44,12	147,36
		4 М					2 191,54		1 753,23	8,98	15 744,01
		ЗТ	чел.-ч	22,5		18					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,288					
		Итого по расценке					2 403,75		1 923,00		22 670,72
		ФОТ							154,18		6 802,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			168,06		7 414,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			84,80		3 741,33
		Всего по позиции							2 175,86		33 826,69
41	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					313,63		56,45	44,12	2 490,57
		2 ЭМ					36,80		6,62	14,35	95,00
		3 в т.ч. ОТм					6,50		1,17	44,12	51,62
		4 М					3 164,96		569,69	8,98	5 115,82
		ЗТ	чел.-ч	36,3		6,534					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,1008					
		Итого по расценке					3 515,39		632,76		7 701,39
		ФОТ							57,62		2 542,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			62,81		2 770,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			31,69		1 398,20
		Всего по позиции							727,26		11 870,58
42	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					197,78		11,87	44,12	523,70
		2 ЭМ					31,77		1,91	14,35	27,41
		3 в т.ч. ОТм					4,58		0,27	44,12	11,91
		4 М					2 068,16		124,09	8,98	1 114,33
		ЗТ	чел.-ч	23,8		1,428					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		0,0222					
		Итого по расценке					2 297,71		137,87		1 665,44
		ФОТ							12,14		535,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			13,23		583,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6,68		294,59
		Всего по позиции							157,78		2 543,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Объем=7 / 100	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ					155,54		10,89	44,12	480,47
		2 ЭМ					22,48		1,57	14,35	22,53
		3 в т.ч. ОТм					6,52		0,46	44,12	20,30
		4 М					1 295,94		90,72	8,98	814,67
		ЗТ	чел.-ч	19,59		1,3713					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		0,0357					
		Итого по расценке					1 473,96		103,18		1 317,67
		ФОТ							11,35		500,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			10,33		455,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,22		230,35
		Всего по позиции							118,73		2 003,72
44	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой Объем=7 / 100	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ					283,18		19,82	44,12	874,46
		2 ЭМ					28,03		1,96	14,35	28,13
		3 в т.ч. ОТм					4,04		0,28	44,12	12,35
		4 М					57,28		4,01	8,98	36,01
		ЗТ	чел.-ч	32,4		2,268					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,0224					
		Итого по расценке					368,49		25,79		938,60
		ФОТ							20,10		886,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			22,11		975,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			11,46		505,48
		Всего по позиции							59,36		2 419,57
45	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (Кровли) Объем=7*1,22	м2	8,54	1	8,54	79,64		680,13	8,98	6 107,57
		Всего по позиции							680,13		6 107,57
46	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					454,46		27,27	44,12	1 203,15
		2 ЭМ					51,99		3,12	14,35	44,77
		3 в т.ч. ОТм					7,80		0,47	44,12	20,74
		4 М					4 156,30		249,38	8,98	2 239,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	52,6		3,156					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,0384					
		Итого по расценке					4 662,75		279,77		3 487,35
		ФОТ							27,74		1 223,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			30,24		1 334,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15,26		673,14
		Всего по позиции							325,27		5 494,53
47	ФЕР10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					237,45		14,25	44,12	628,71
		2 ЭМ					89,00		5,34	14,35	76,63
		3 в т.ч. ОТм					11,47		0,69	44,12	30,44
		4 М					4 096,17		245,77	8,98	2 207,01
		ЗТ	чел.-ч	26,8		1,608					
		ЗТм	чел.-ч	0,9		0,054					
		Итого по расценке					4 422,62		265,36		2 912,35
		ФОТ							14,94		659,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			16,28		718,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8,22		362,53
		Всего по позиции							289,86		3 993,35
48	ФЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	100 м2	0,0252	1	0,0252					
		Объем=(0,6*2,1*2) / 100									
		1 ОТ					58,69		1,48	44,12	65,30
		2 ЭМ					93,21		2,35	14,35	33,72
		3 в т.ч. ОТм					26,83		0,68	44,12	30,00
		4 М					3,39		0,09	8,98	0,81
		ЗТ	чел.-ч	6,88		0,173376					
		ЗТм	чел.-ч	2,1		0,05292					
		Итого по расценке					155,29		3,92		99,83
		ФОТ							2,16		95,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,97		86,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,02		44,79
		Всего по позиции							6,91		231,34
49	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	2	1	2	94,68		189,36	8,98	1 700,45
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							189,36		1 700,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФССЦ-11.2.02.12-0001	Полотна дверные деревянные (Проемы (ремонтно-строительные))	м2	2,52	1	2,52	280,00		705,60	8,98	6 336,29
									705,60		6 336,29
51	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=36 / 100	100 м2	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					75,25		27,09	44,12	1 195,21
		2 ЭМ					61,87		22,27	14,35	319,57
		3 в т.ч. ОТм					2,32		0,84	44,12	37,06
		4 М					1,84		0,66	8,98	5,93
		ЗТ	чел.-ч	8,98		3,2328					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,072					
							Итого по расценке	138,96	50,02		1 520,71
							ФОТ		27,93		1 232,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			30,44		1 343,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15,36		677,75
									95,82		3 541,63
52	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,004968	1	0,004968	37 565,22		186,62	8,98	1 675,85
									186,62		1 675,85
Итого по разделу 11 Уличный туалет :											
									Итого прямые затраты (справочно)		7 353,69
									в том числе:		
									Оплата труда рабочих		460,64
									Эксплуатация машин		333,65
									в том числе оплата труда машинистов (Отм)		41,56
									Материалы		6 293,72
									Перевозка		265,68
									Строительные работы		8 220,60
									Строительные работы		7 954,92
									в том числе:		
									оплата труда		460,64
									эксплуатация машин и механизмов		333,65
									в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		41,56
									материалы		6 293,72
									накладные расходы		559,67
									сметная прибыль		307,24
									Перевозка		265,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							502,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							559,67		
		Итого сметная прибыль (справочно)							307,24		
		Итого по разделу 11 Уличный туалет							8 220,60		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							100 082,04		1 268 974,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 243,00		363 681,12
		Эксплуатация машин							12 798,88		183 663,90
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							840,61		37 087,71
		Материалы							77 021,70		691 654,91
		Перевозка							2 018,46		29 974,14
		Строительные работы							114 921,92		1 923 708,11
		Строительные работы							112 903,46		1 893 733,97
		в том числе:									
		оплата труда							8 243,00		363 681,12
		эксплуатация машин и механизмов							12 798,88		183 663,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							840,61		37 087,71
		материалы							77 021,70		691 654,91
		накладные расходы							9 566,86		422 089,95
		сметная прибыль							5 273,02		232 644,09
		Перевозка							2 018,46		29 974,14
		Итого ФОТ (справочно)							9 083,61		400 768,83
		Итого накладные расходы (справочно)							9 566,86		422 089,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 273,02		232 644,09
		Непредвиденные затраты 2%							2 298,44		38 474,16
		Итого с непредвиденными							117 220,36		1 962 182,27
		НДС 20%							23 444,07		392 436,45
		ВСЕГО по смете							140 664,43		2 354 618,72
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7 853,75		70 526,69

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ПРОТОКОЛ схода, собрания или конференции граждан

Д. Левоплосская (летняя концертная площадка)
(место проведения)

«22» августа 2023 г.

Время проведения собрания: 19.00 часов.

Организатор: Ибрагимова Н.В.

Секретарь: Пекарская М.В.

Присутствовали: Пятнадцать человек (список прилагается)

Собрание созвано по инициативе председателя ТОС «Плоское» Ибрагимовой Надежды Васильевны.

Повестка дня

О выдвижении инициативного проекта «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют» для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Слушали:

1. Ибрагимову Надежду Васильевну, председателя ТОС «Плоское».

Надежда Васильевна рассказала, что в срок до «31» августа 2023 года осуществляется прием инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В этой связи предлагаю к рассмотрению и выдвижению для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета инициативный проект «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют».

Благоустройство территории проведения деревенского праздника.

Голосовали: «за» – 10;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решили:

Признать целесообразным и соответствующим интересам жителей инициативный проект «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют» и поддержать выдвижение инициативного проекта «Парк отдыха Деревенское раздолье - комфорт и уют», для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Инициатор проекта (его представитель):




Н.В.Ибрагимова

Список лиц, присутствовавших на сходе, собрании или конференции граждан

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактный телефон	Подпись*
1	Ибрагимова Зарина Васильевна	89210849428	Иб
2	Куртсев Виктор Александрович	89216002496	Куртс
3	Куртсев Алексей Викторович	89314004617	Куртс
4	Куртсев Николай Александрович	89210786309	Куртс
5	Истоминна Анастасия Михайловна	89314057842	Истомин
6	Ромашова Оксана Борисовна	89314007527	Ром
7	Ромашова Ольга Владимировна	89210836316	Ромашова
8	Леккерская Мария Владимировна	89218103563	Леккерс
9	Сухарева Екатерина Ивановна	89214791477	Сухарева
10	Добин Евгений Викторович	89216002510	Добин

* Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в таблице, и совершение всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» инициатором проекта, администрацией Устьянского муниципального округа Архангельской области, администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях рассмотрения, оценки и отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем представления заявления в простой письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных.

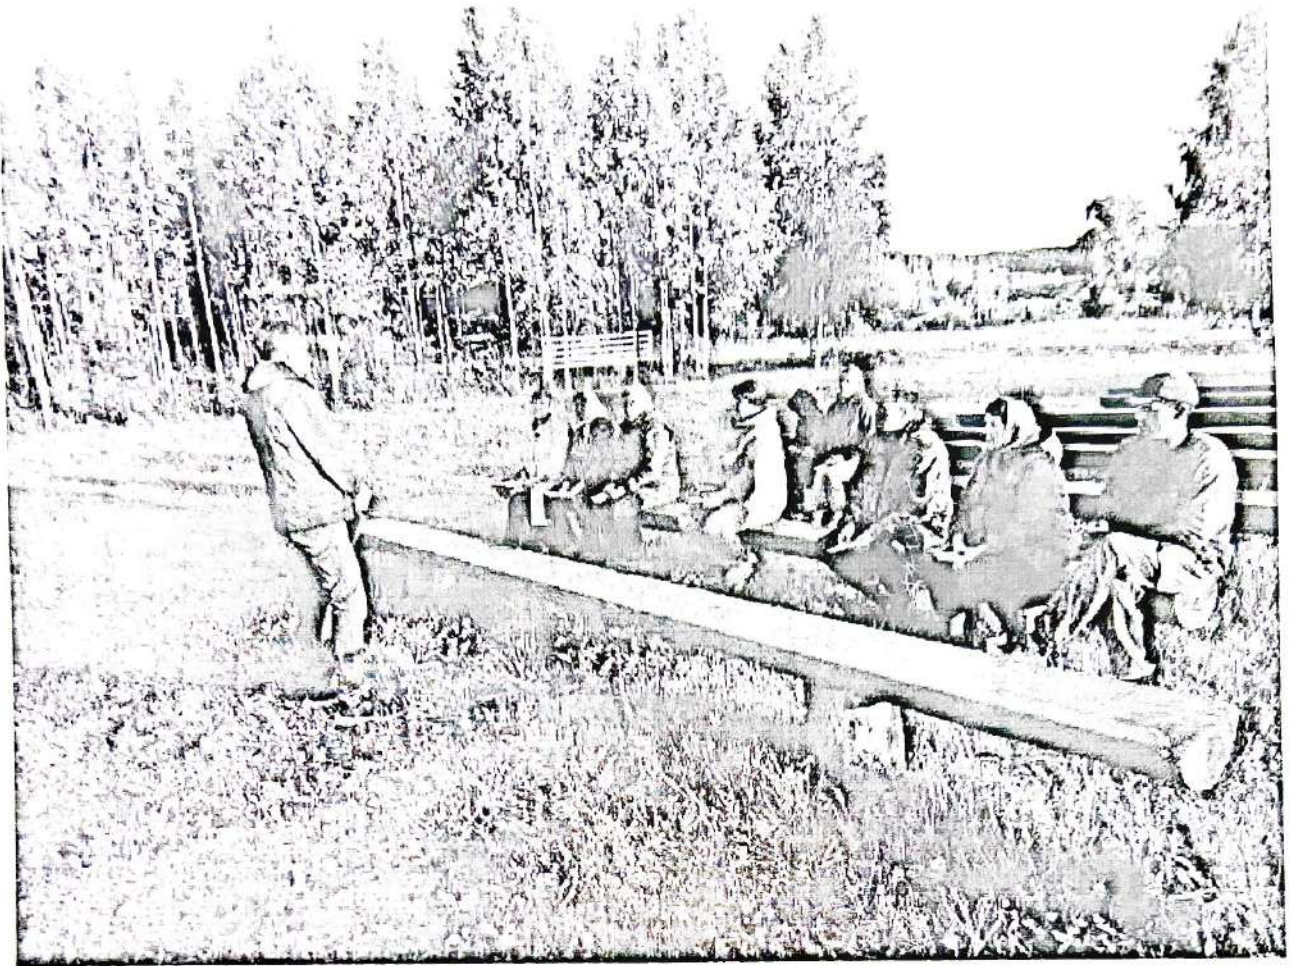

Администрация Устьянского муниципального района
Архангельской области

Разрешение на использование земли
без предоставления земельного участка
№ 36 от 07 апреля 2021 года

Выдано: Администрации МО «Плоское», ИНН 2922006820, ОГРН 1052907033937, юридический адрес: 165243, Архангельская область, Устьянский район, д. Левоплоская, ул. Молодежная, 18.

Основание: постановление администрации Устьянского муниципального района Архангельской области от 07 апреля 2021 года № 493 «Об использовании земли без предоставления земельного участка администрации муниципального образования «Плоское».

Объект: земельный участок в кадастровом квартале 29:18:020901, местоположение: примерно в 170 метрах по направлению на северо-запад от ориентира здание жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Устьянский муниципальный район, МО "Плоское", д. Левоплоская, ул. Центральная, д. 33. площадью 6400 кв.м.

Координаты:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	311 735	3 390 455
2	311 795	3 390 508
3	311 741	3 390 568
4	311 682	3 390 514

Приложение: схема использования земли на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:020901.

Цель использования земли: для организации обслуживания зон отдыха населения

Срок действия разрешения: на период размещения зоны отдыха.

Обязанности лица, использующего земли (в случае, если использование земли привело к порче, либо плодородного слоя земли):

- привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по рекультивации.


Администрация МО «Плоское» обязана использовать землю в указанных целях, на указанных участках запрещено строительство объектов капитального строительства.

Особые условия:

- действие разрешения на использование земель прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу:

Приложение: схема использования земли на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:020901 – 1 л.

Исполняющий обязанности главы
Устьянского муниципального района




С.А. Молчановский

**Схема использования земли на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:18:020901**



Масштаб 1: 1000

Условные обозначения:

- 29:18:020901 - обозначение кадастрового квартала
- ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
- граница образуемого земельного участка
-  - существующий земельный участок
